



We Love Ingredients.

**Die
erfolgreiche
Big Bang
Conversion
auf SAP
S/4HANA**



Bertram Günther
Projektleitung S/4 Conversion
Tel: +49 6291 92452
E-Mail: bertram.guenther@azo.com



Maximilian Linsler
Software Development
Tel: +49 6291 92511
E-Mail: maximilian.linsler@azo.com

Die erfolgreiche Big Bang Conversion auf SAP S/4HANA




ECC 6.0 Unicode EHP7



S/4 HANA 2022 SP3



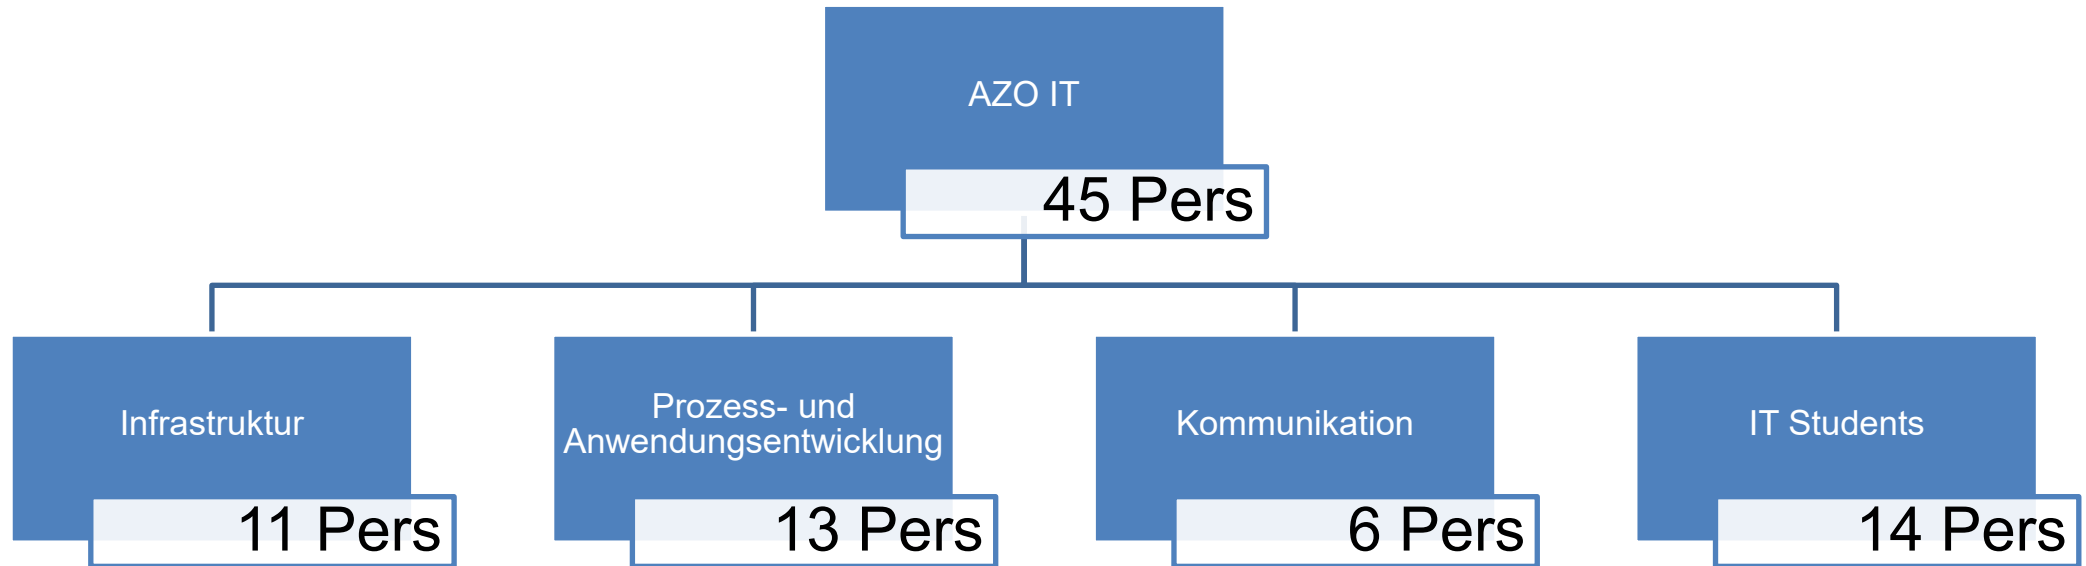

Prozessberatung (~3P)

ABAP-Entwicklung (~5P)

Sonstige

Team Leader IT Applications & Development										
IT SAP Process & Module Consulting										
IT SAP Process & Module Consulting										
IT SAP Process & Module Consulting										
IT SAP Process & Module Consulting										
IT Business Applications										
IT Business Applications										
IT Business Applications										
IT Business Applications & BI										
IT Microsoft Applications Consulting										
IT CAD Applications & Consulting										
IT CAD Applications & Consulting										
IT CAD Applications & Consulting										




- Custom Code Adaption
- Testmanagement
- Testen

- Projektsteuerung
- Basisthemen
- Customizing
- Simplification Items

- Datenmapping
- Datenmigration

SAP S/4HANA offers flexibility of consumption

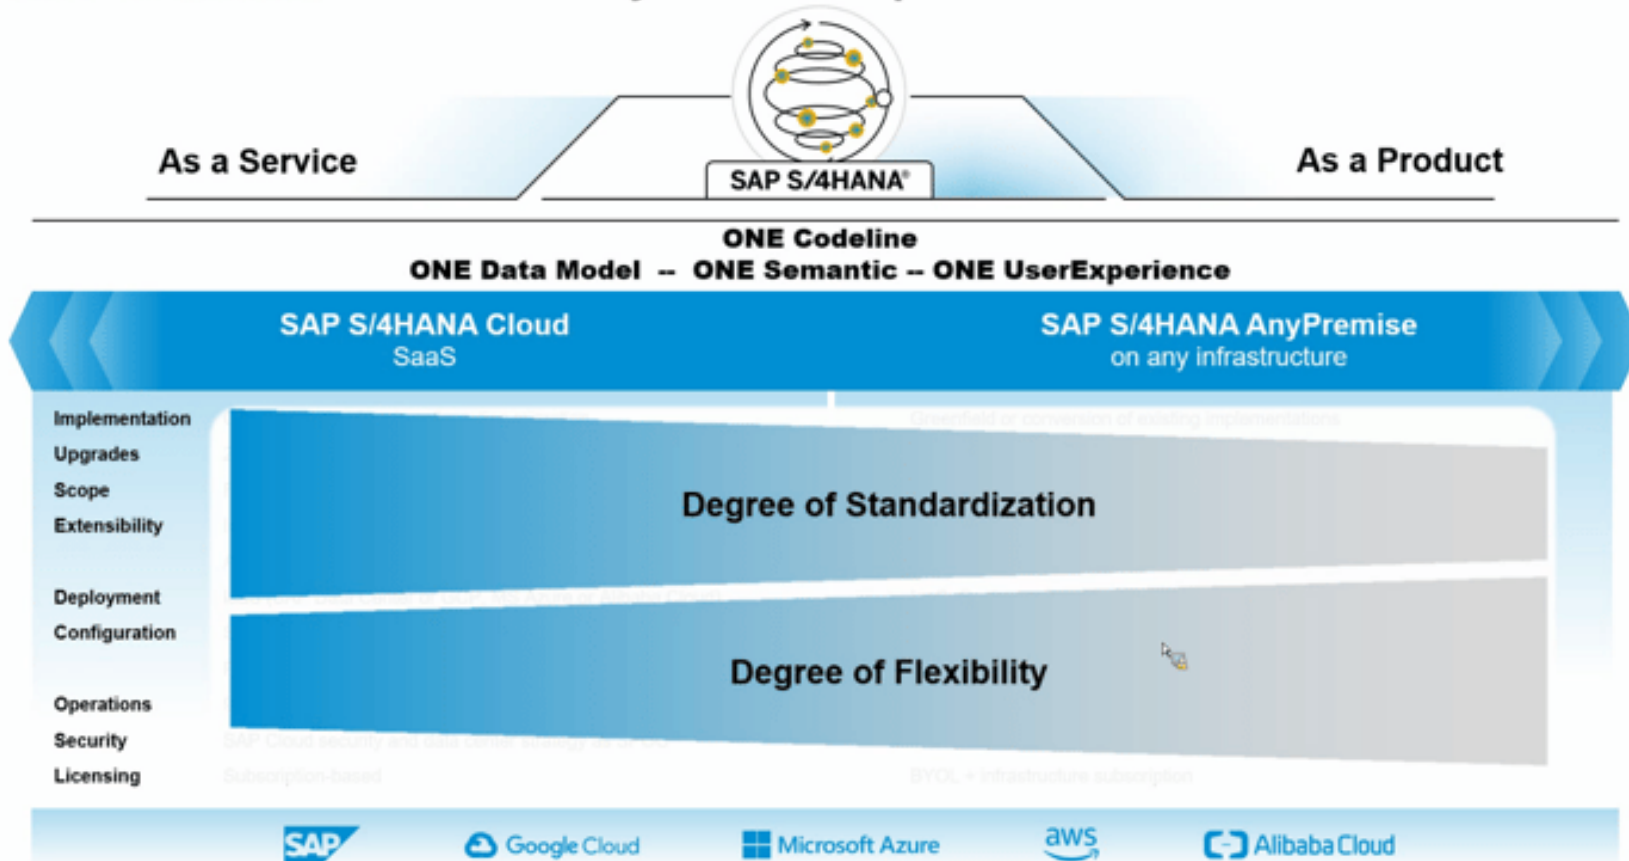

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | Partner

5

Greenfield

- „Starting from scratch“
- Neues, leeres S/4 System
- Keine Z-Einstellungen
- Keine E-Einstellungen
- Kein Customizing
- Datenübernahme im Live
- Keine Problemfelder
- Livebetrieb wird nicht beeinträchtigt

Brownfield


- Upgrade des bestehenden Live-Systems
- Einstellungen bleiben
- Vorbereitung im ES-System
- Altlasten
- Längere Downtime


Alternative von All for One: Bluefield mit SNP-Tools


Produktiv


Entwicklung


Testing / Datenmigration

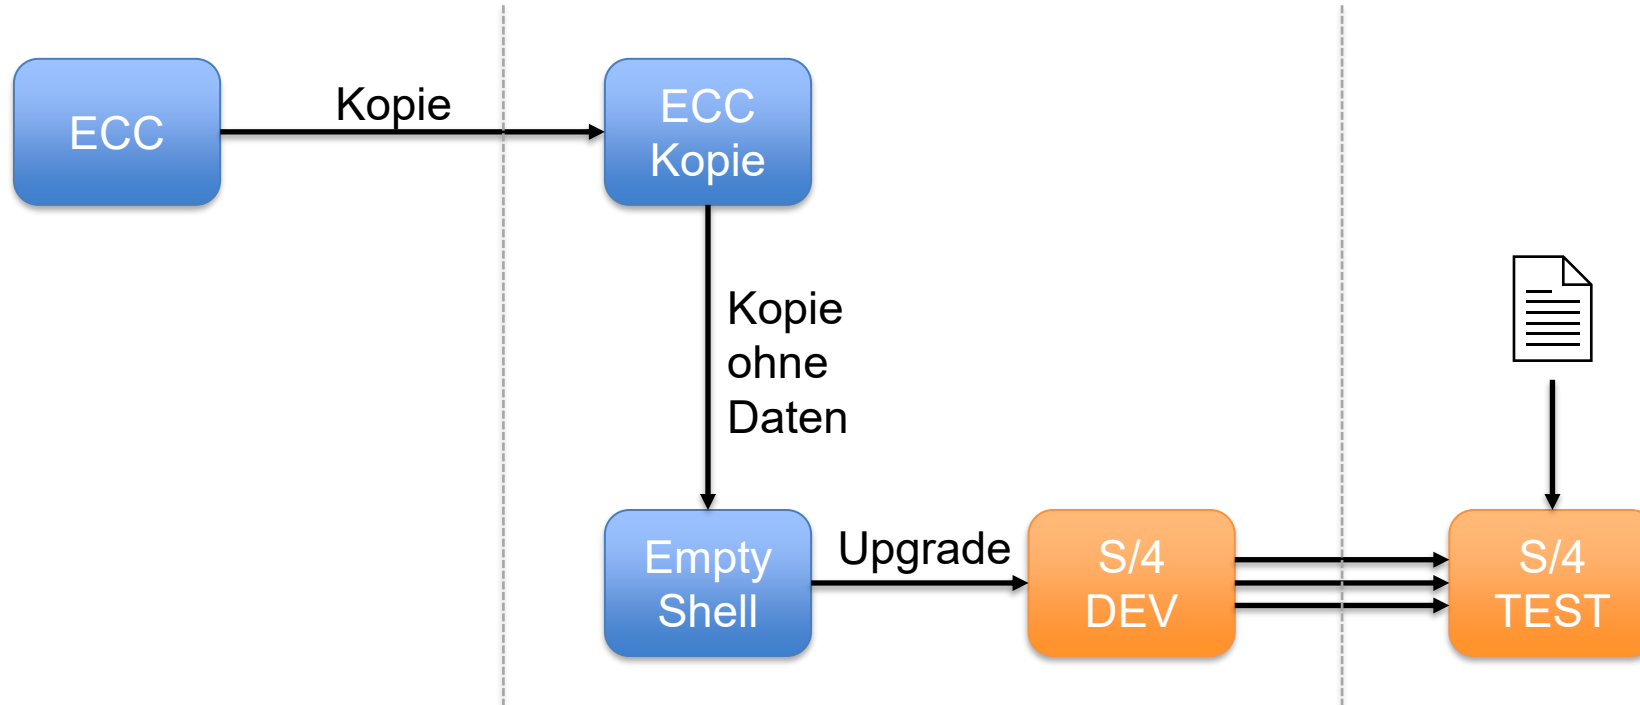


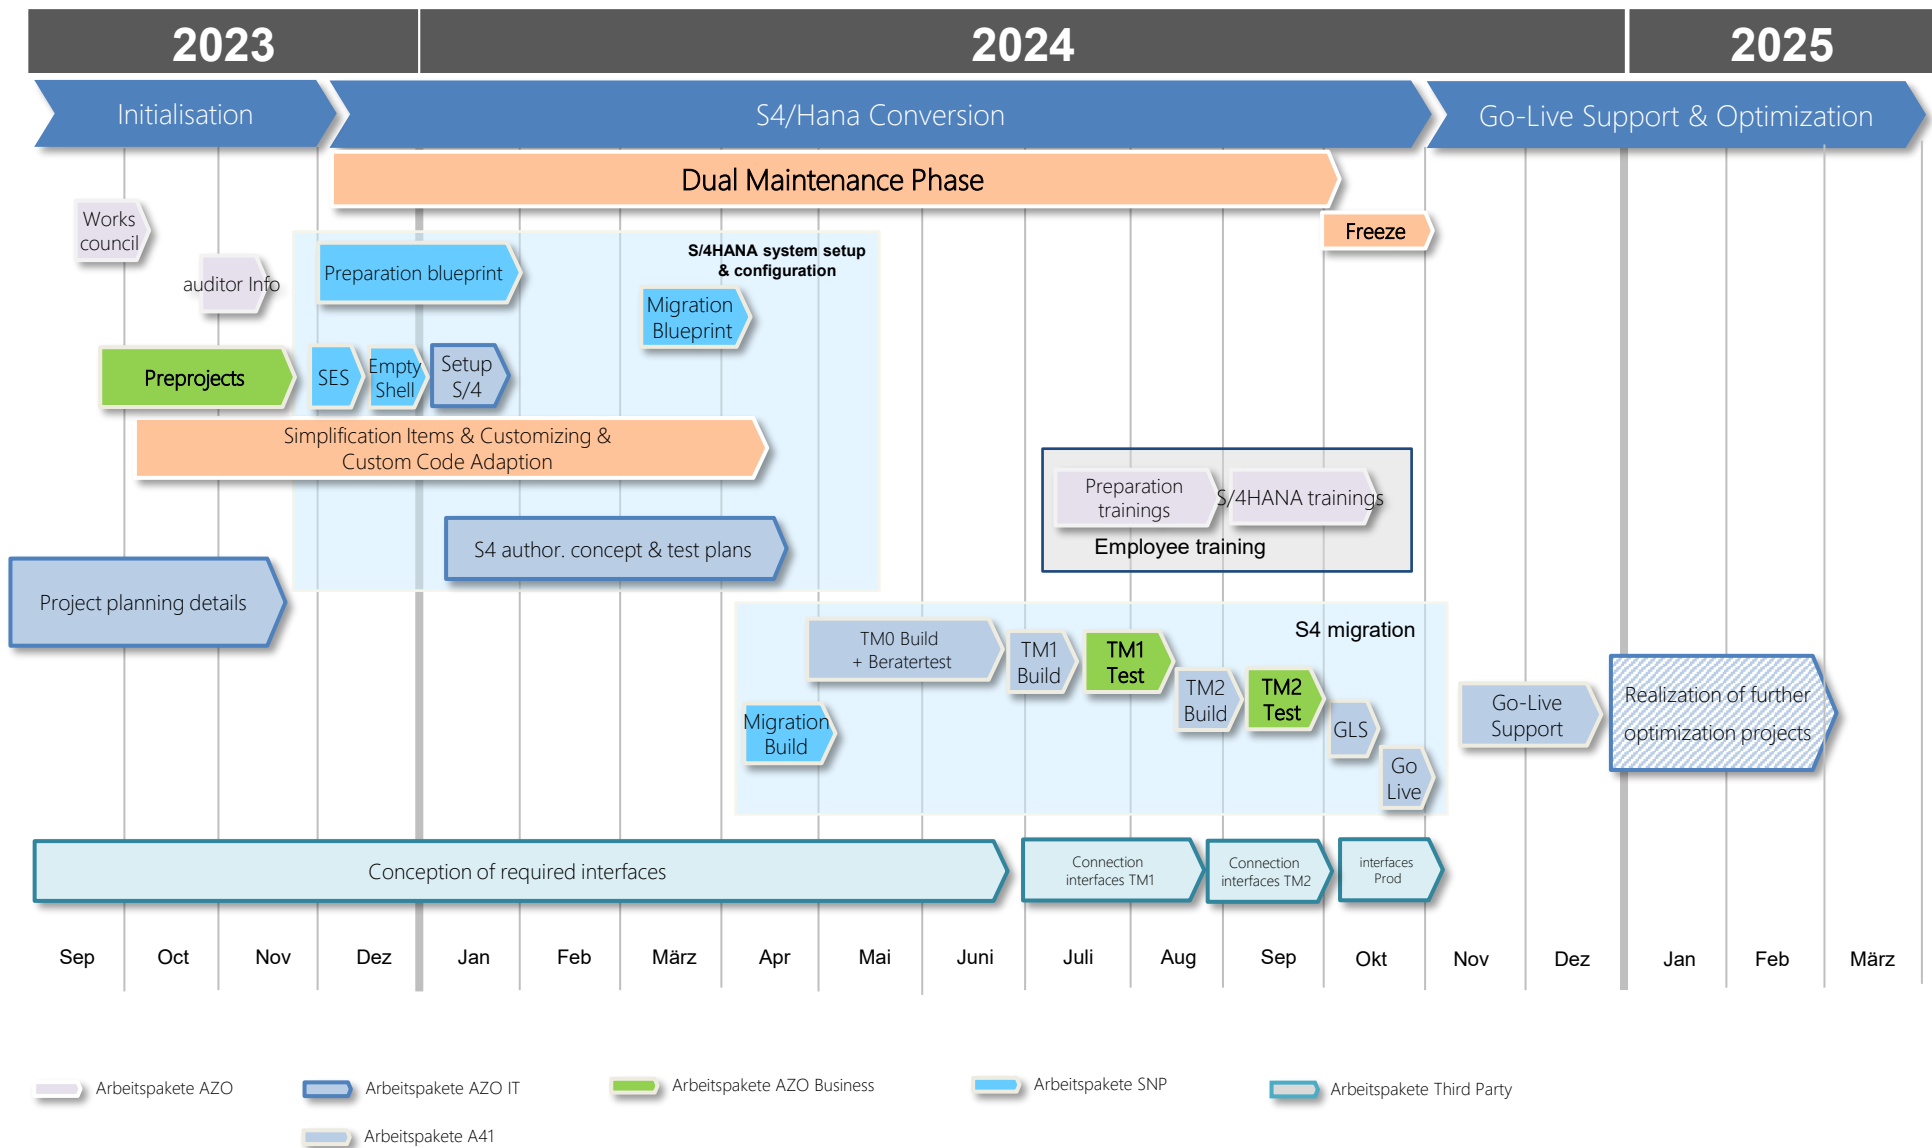

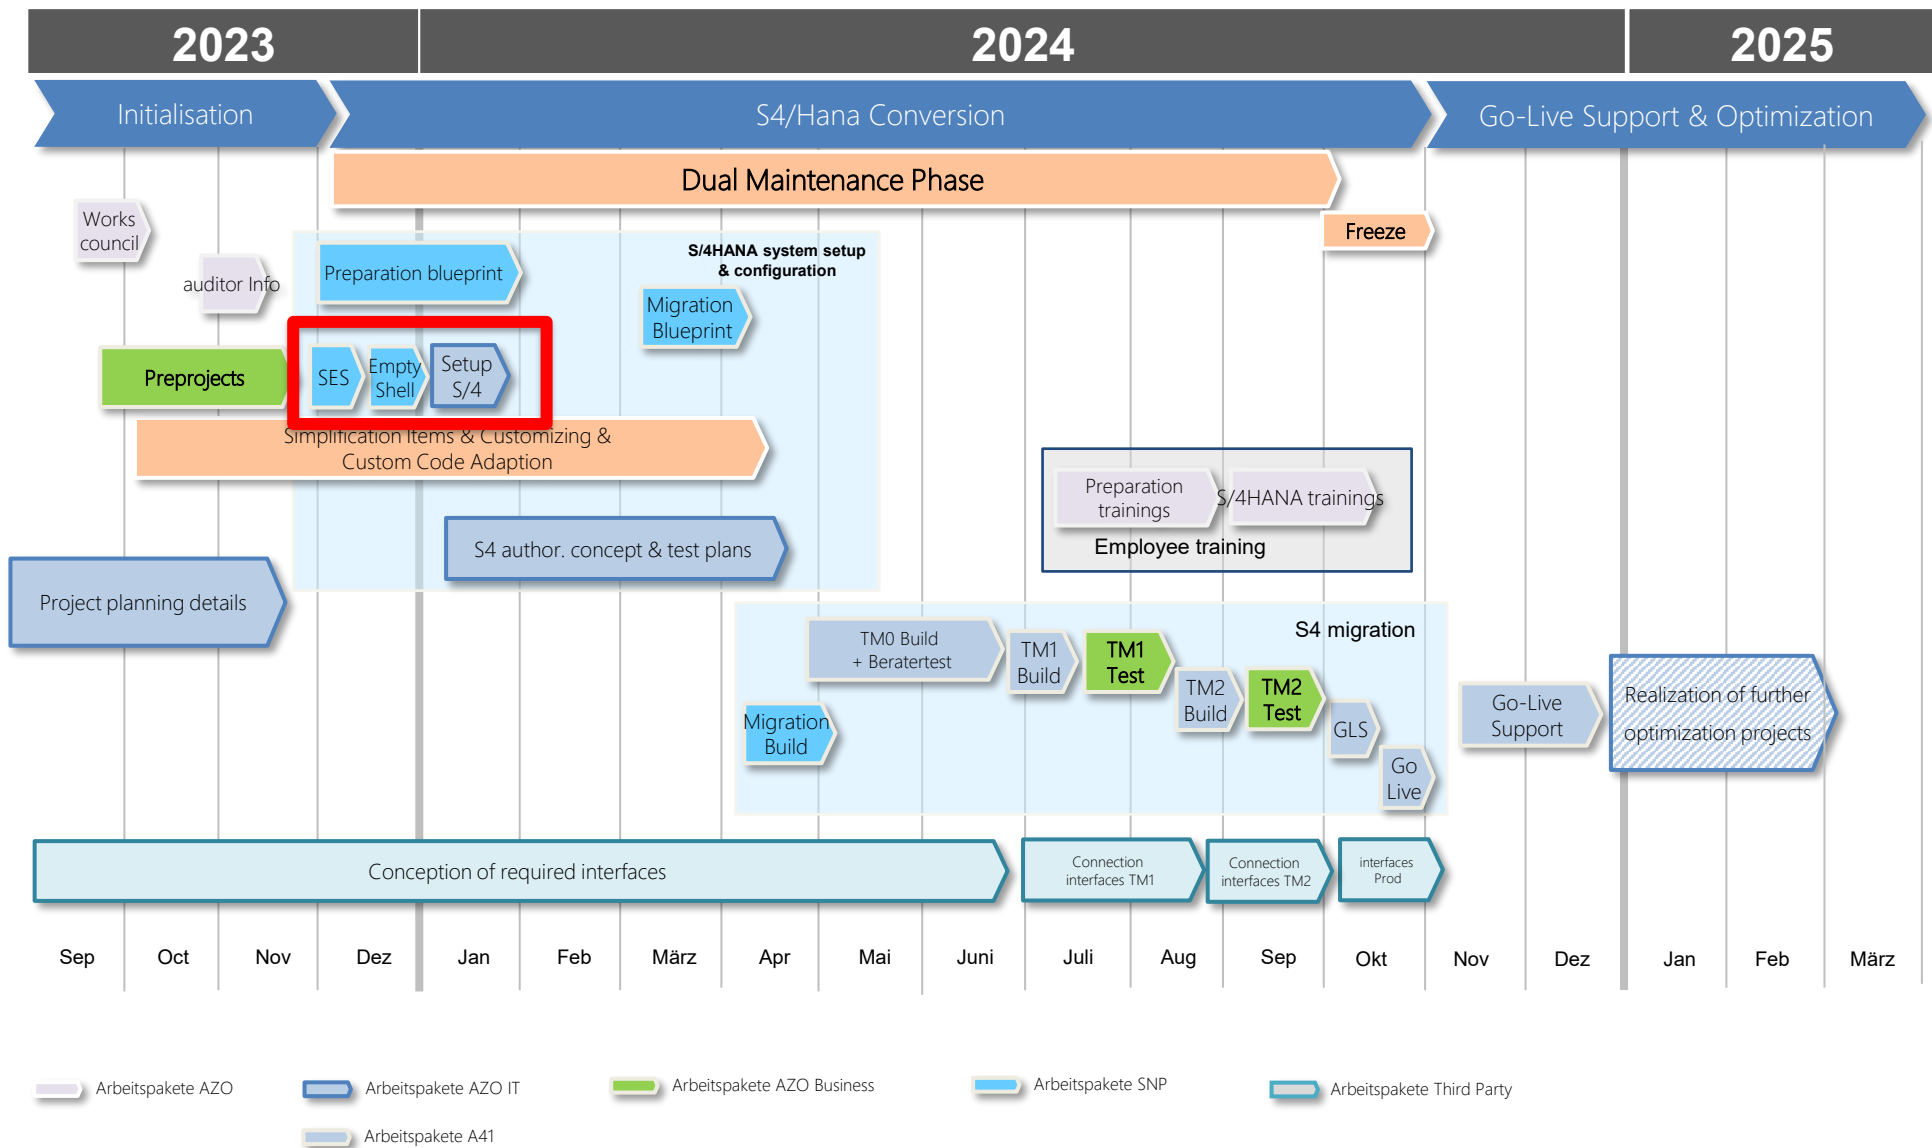


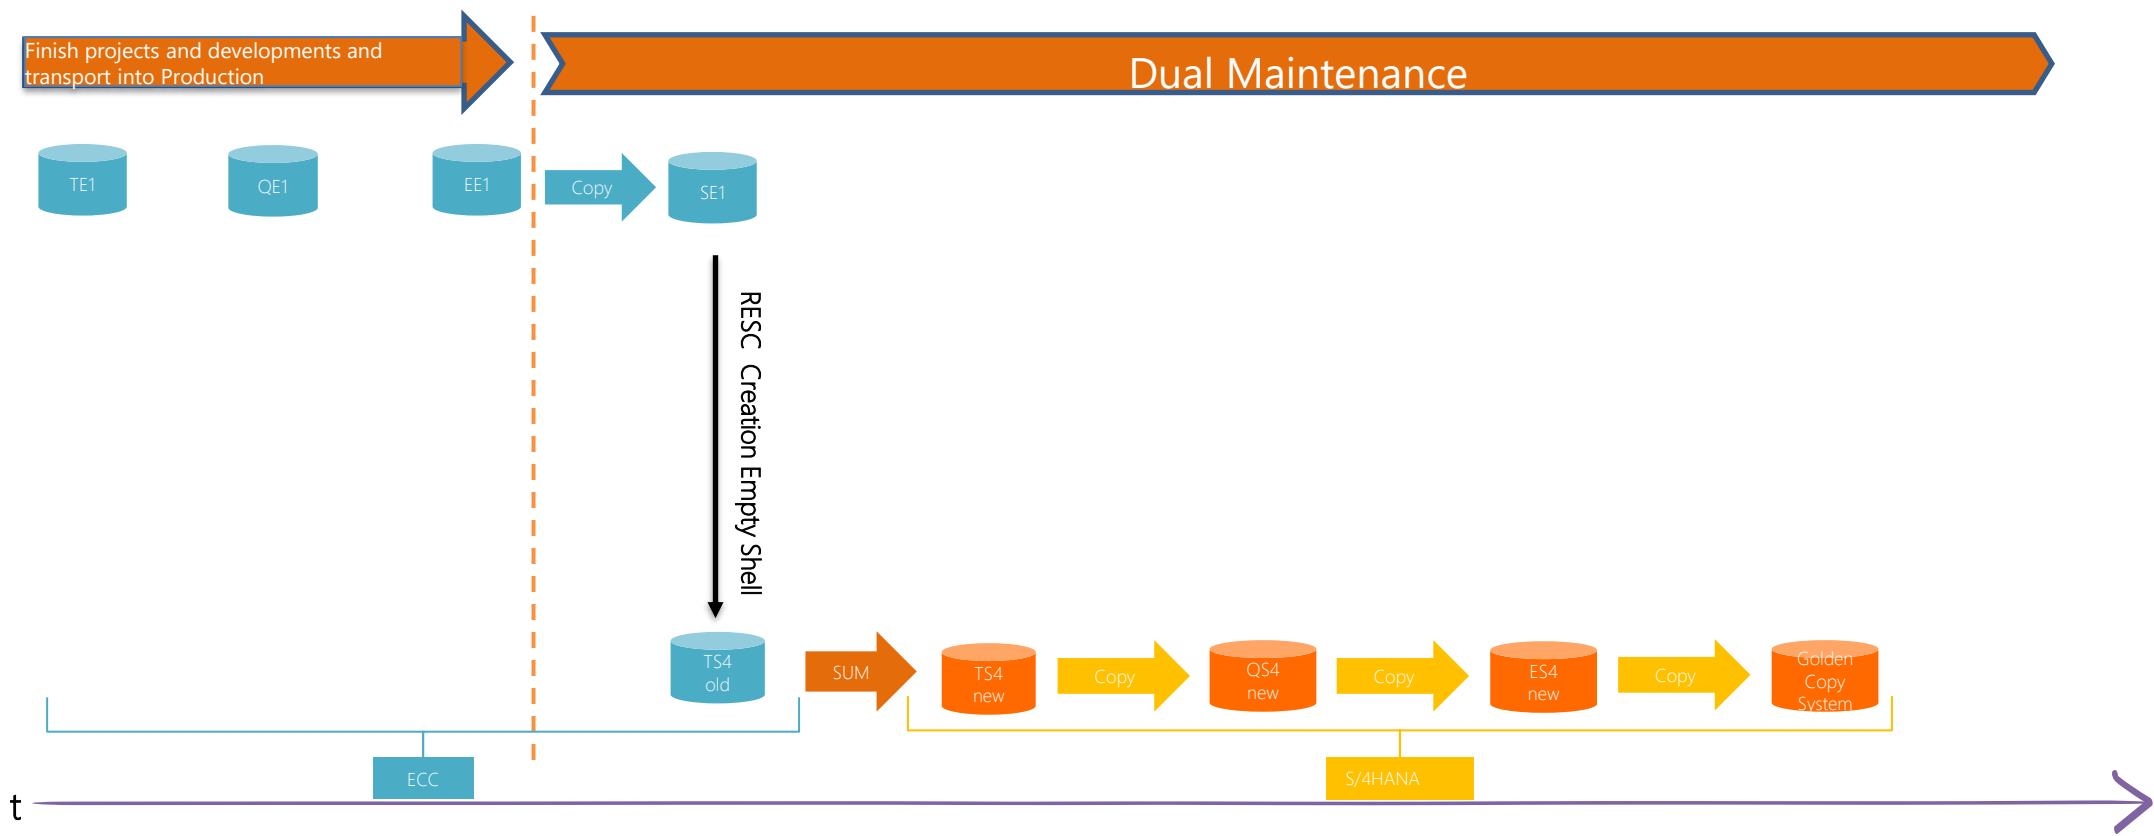


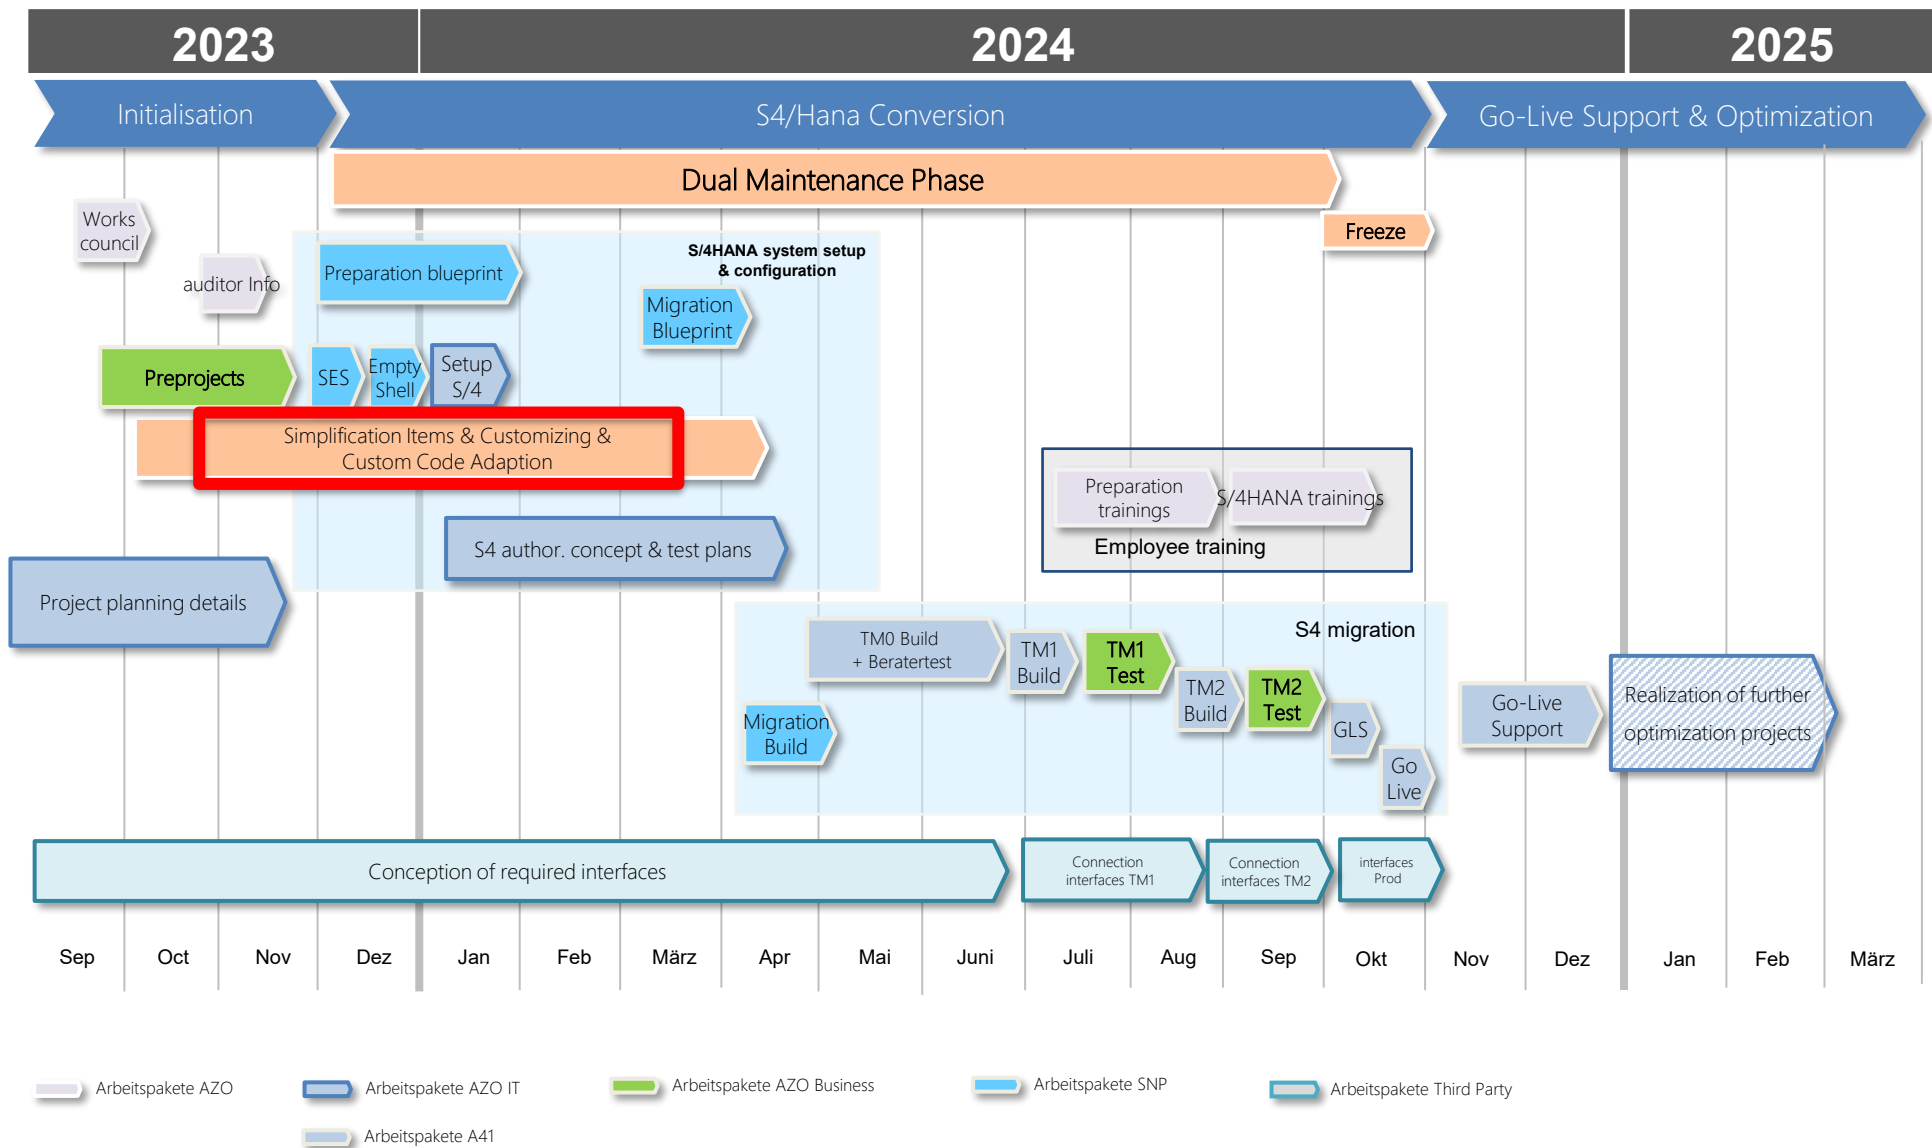

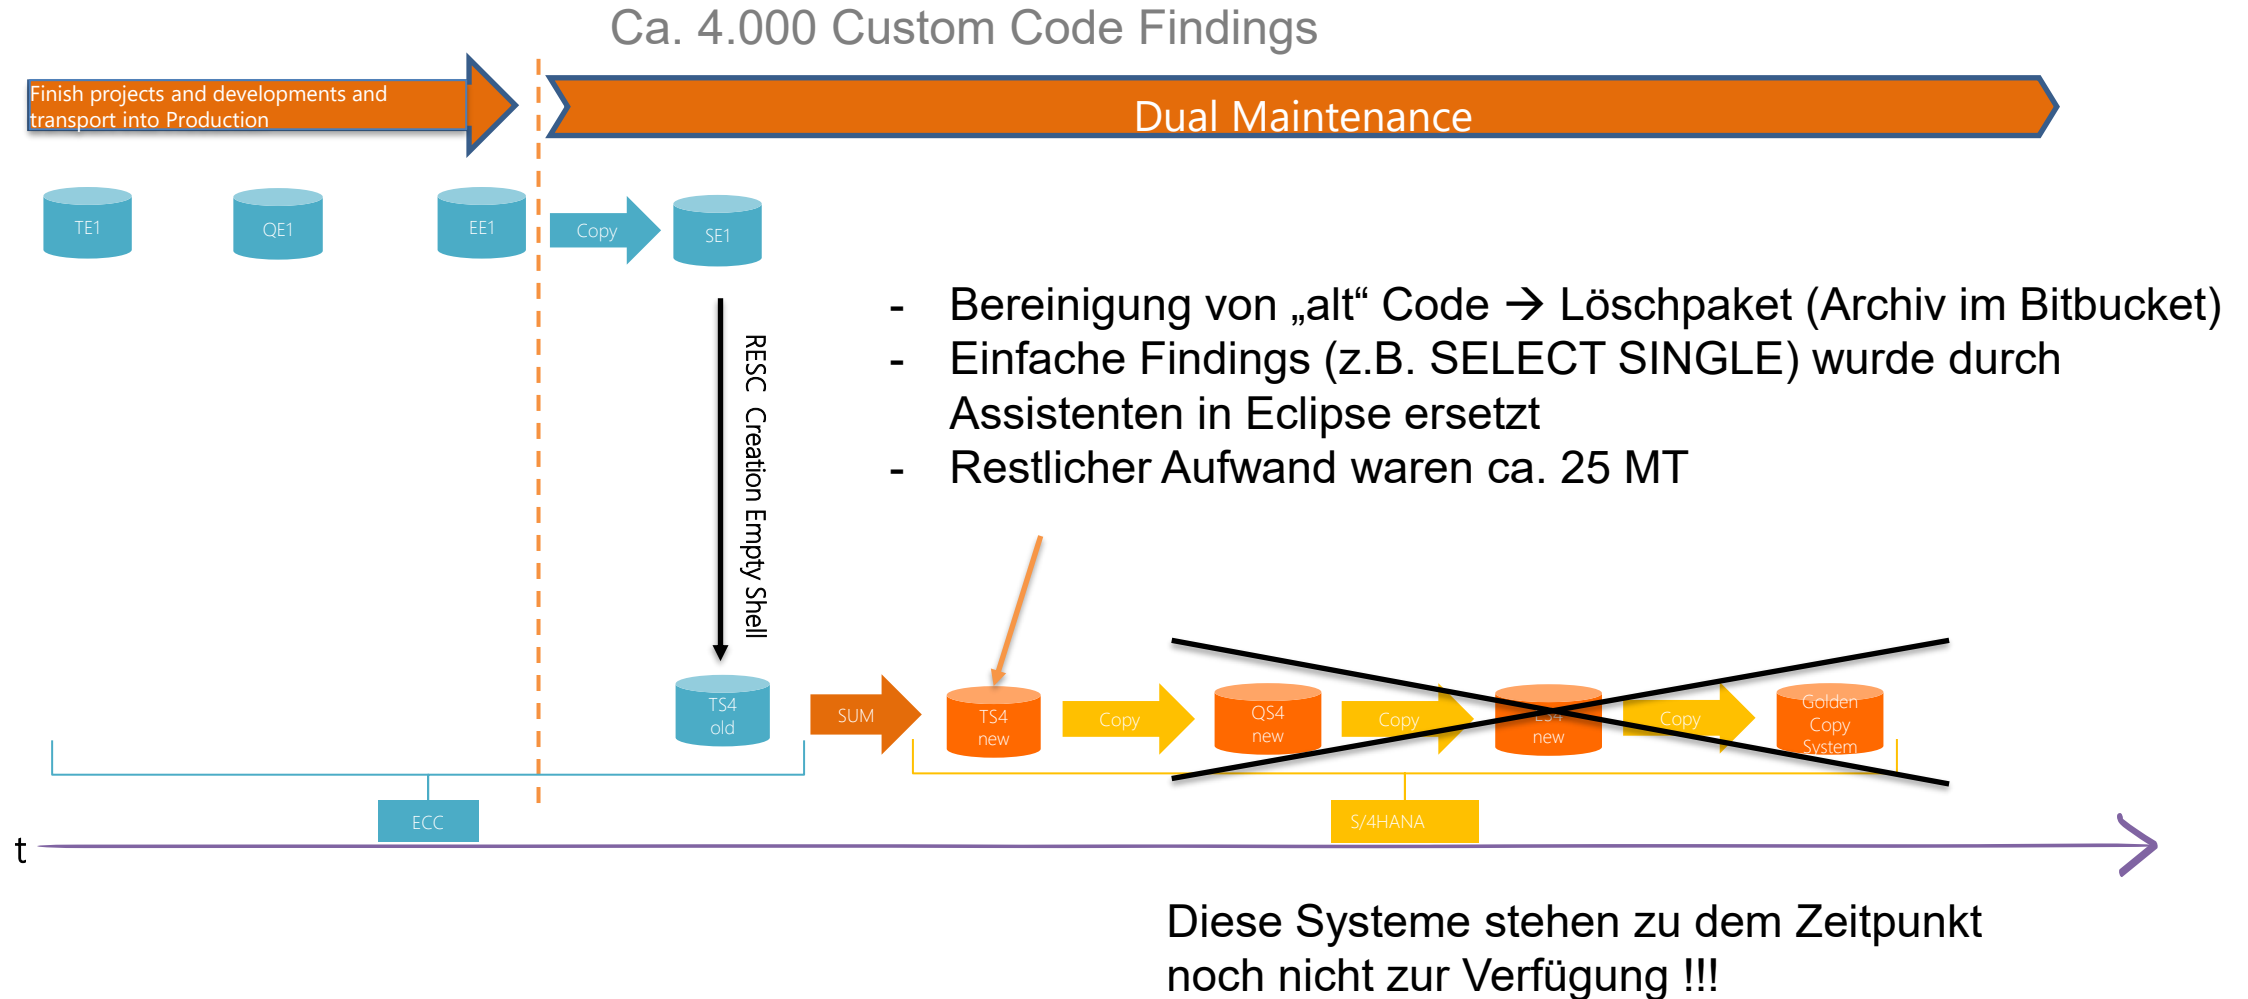

Statistik: Prüfung		Beschrei...	Prio 1	Prio 2	Prio 3
☐	✓ ∑ Summe	Summe	1.640	728	3.019
☐	> 📄 Kritische Anweisungen	Prüftitel		217	
☐	> 📄 Problemat.Anweisungen für Ergebnis von SELECT/OPEN CURSOR ohne ORDER BY suchen	Prüftitel	58	61	2.235
☐	> 📄 S/4HANA: Feldlängenerweiterungen	Prüftitel	148	320	526
☐	> 📄 S/4HANA: Idoc Check	Prüftitel		4	
☐	> 📄 S/4HANA: Readiness Check für SAP Queries	Prüftitel	18		
☐	> 📄 S/4HANA: Suche nach Basistabell				
☐	> 📄 S/4HANA: Suche nach Datenbank				
☐	> 📄 S/4HANA: Suche nach Syntaxfehle				
☐	> 📄 S/4HANA: Suche nach Verwendu				
☐	> 📄 S/4HANA: Suche nach vereinfacht				
☐	> 📄 Voraussetzungen für den Test				

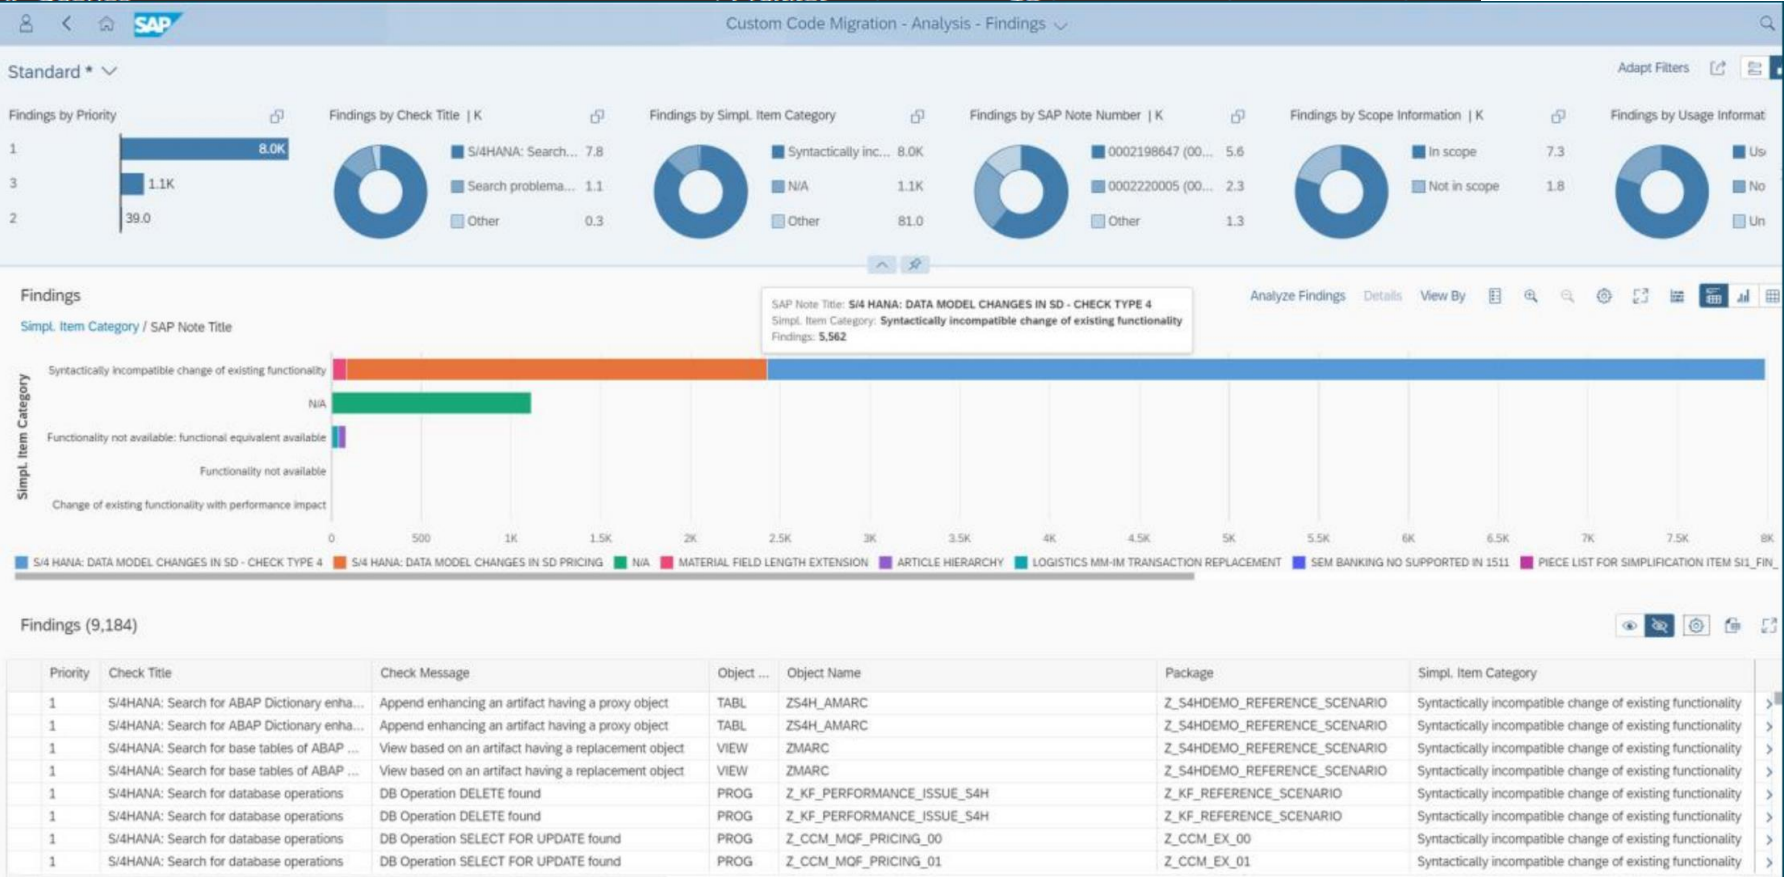

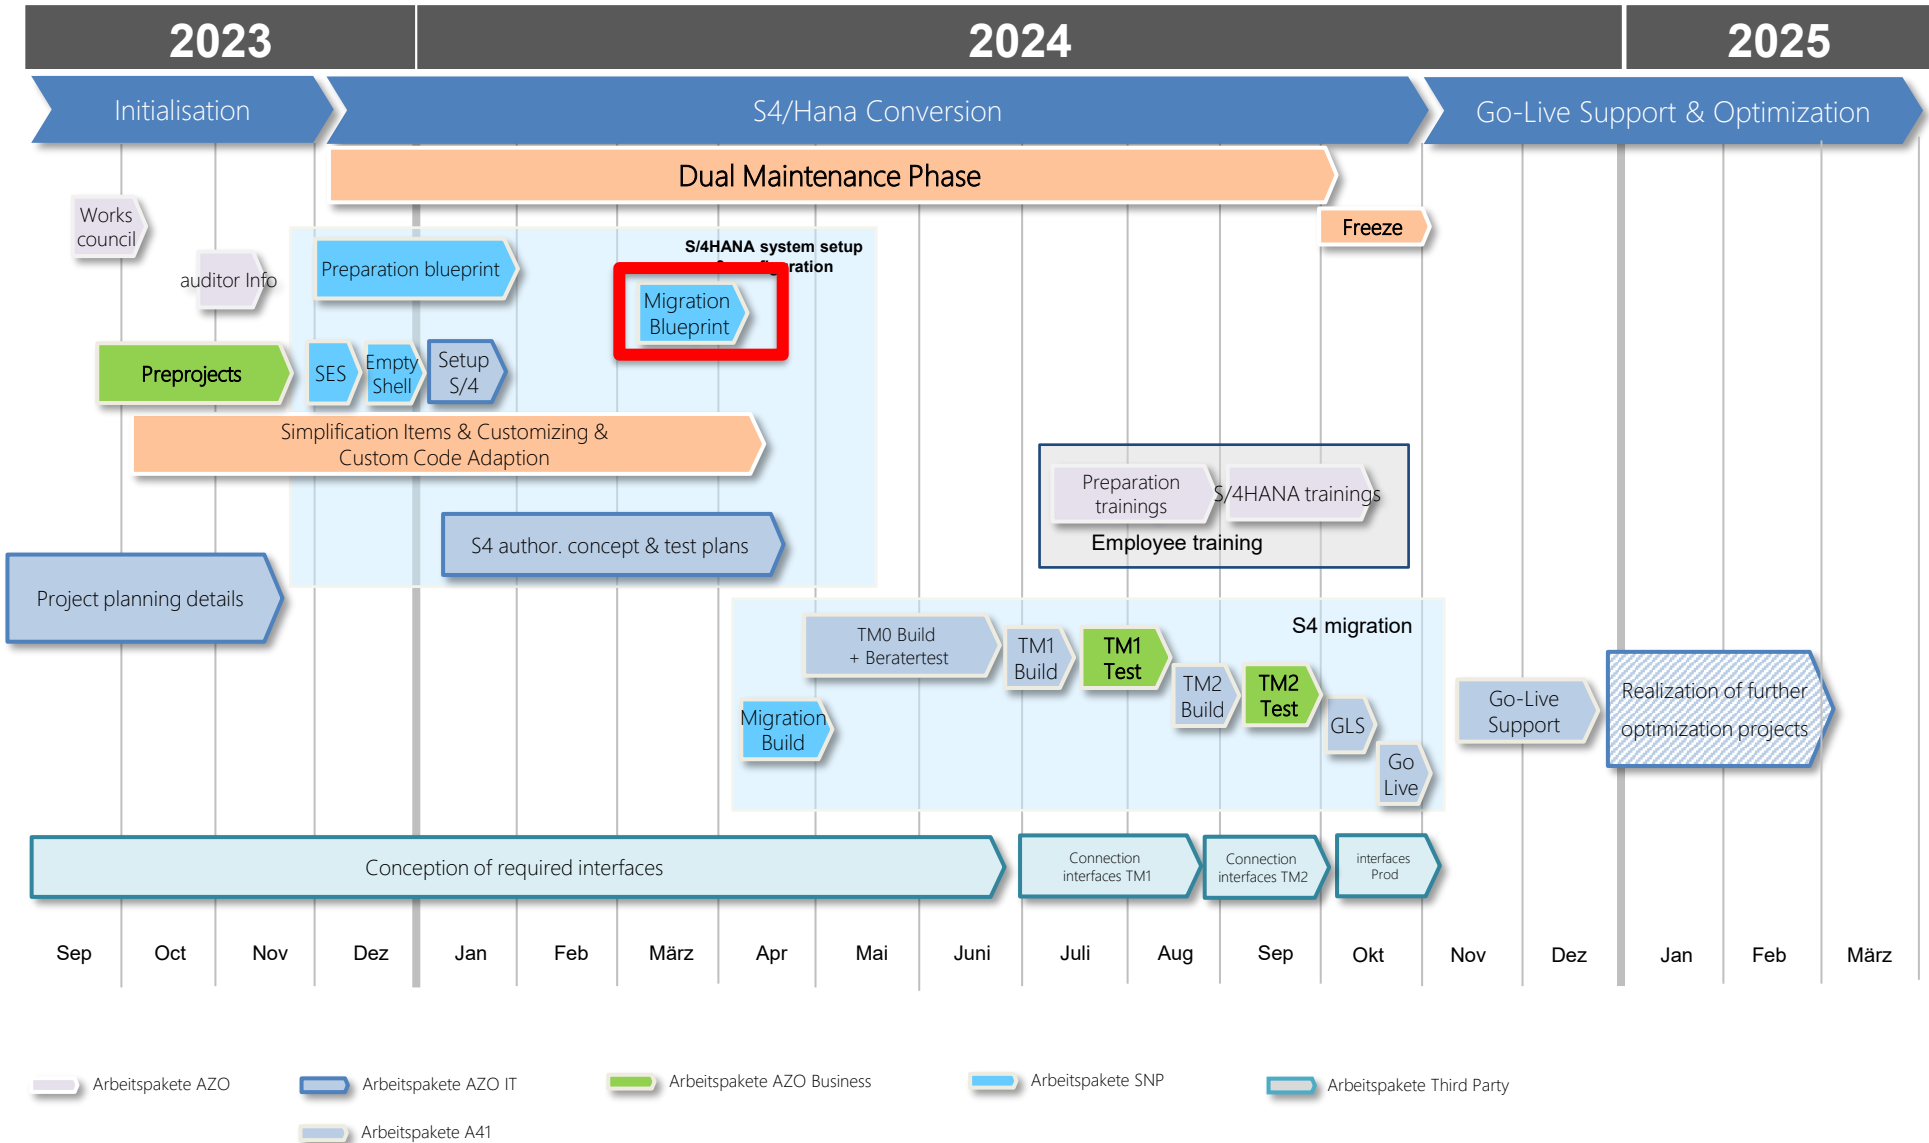

Migrationsworkshops

Thema:

- Aufnahme der AZO Anforderungen zur Migration
- Erstellung Version Migrations Blueprint

Teilnehmer:

- AZO Berater
- All for One Modulberater
- All for One Poland Migration Consultant




Durchführung pro Modul


Dauer ca. 1 – 2 Stunden


Checklistencharakter (Excel)

Sprache: Englisch

Möglichkeit Daten
zurückzulassen
oder zu ändern
(regelbasiert)

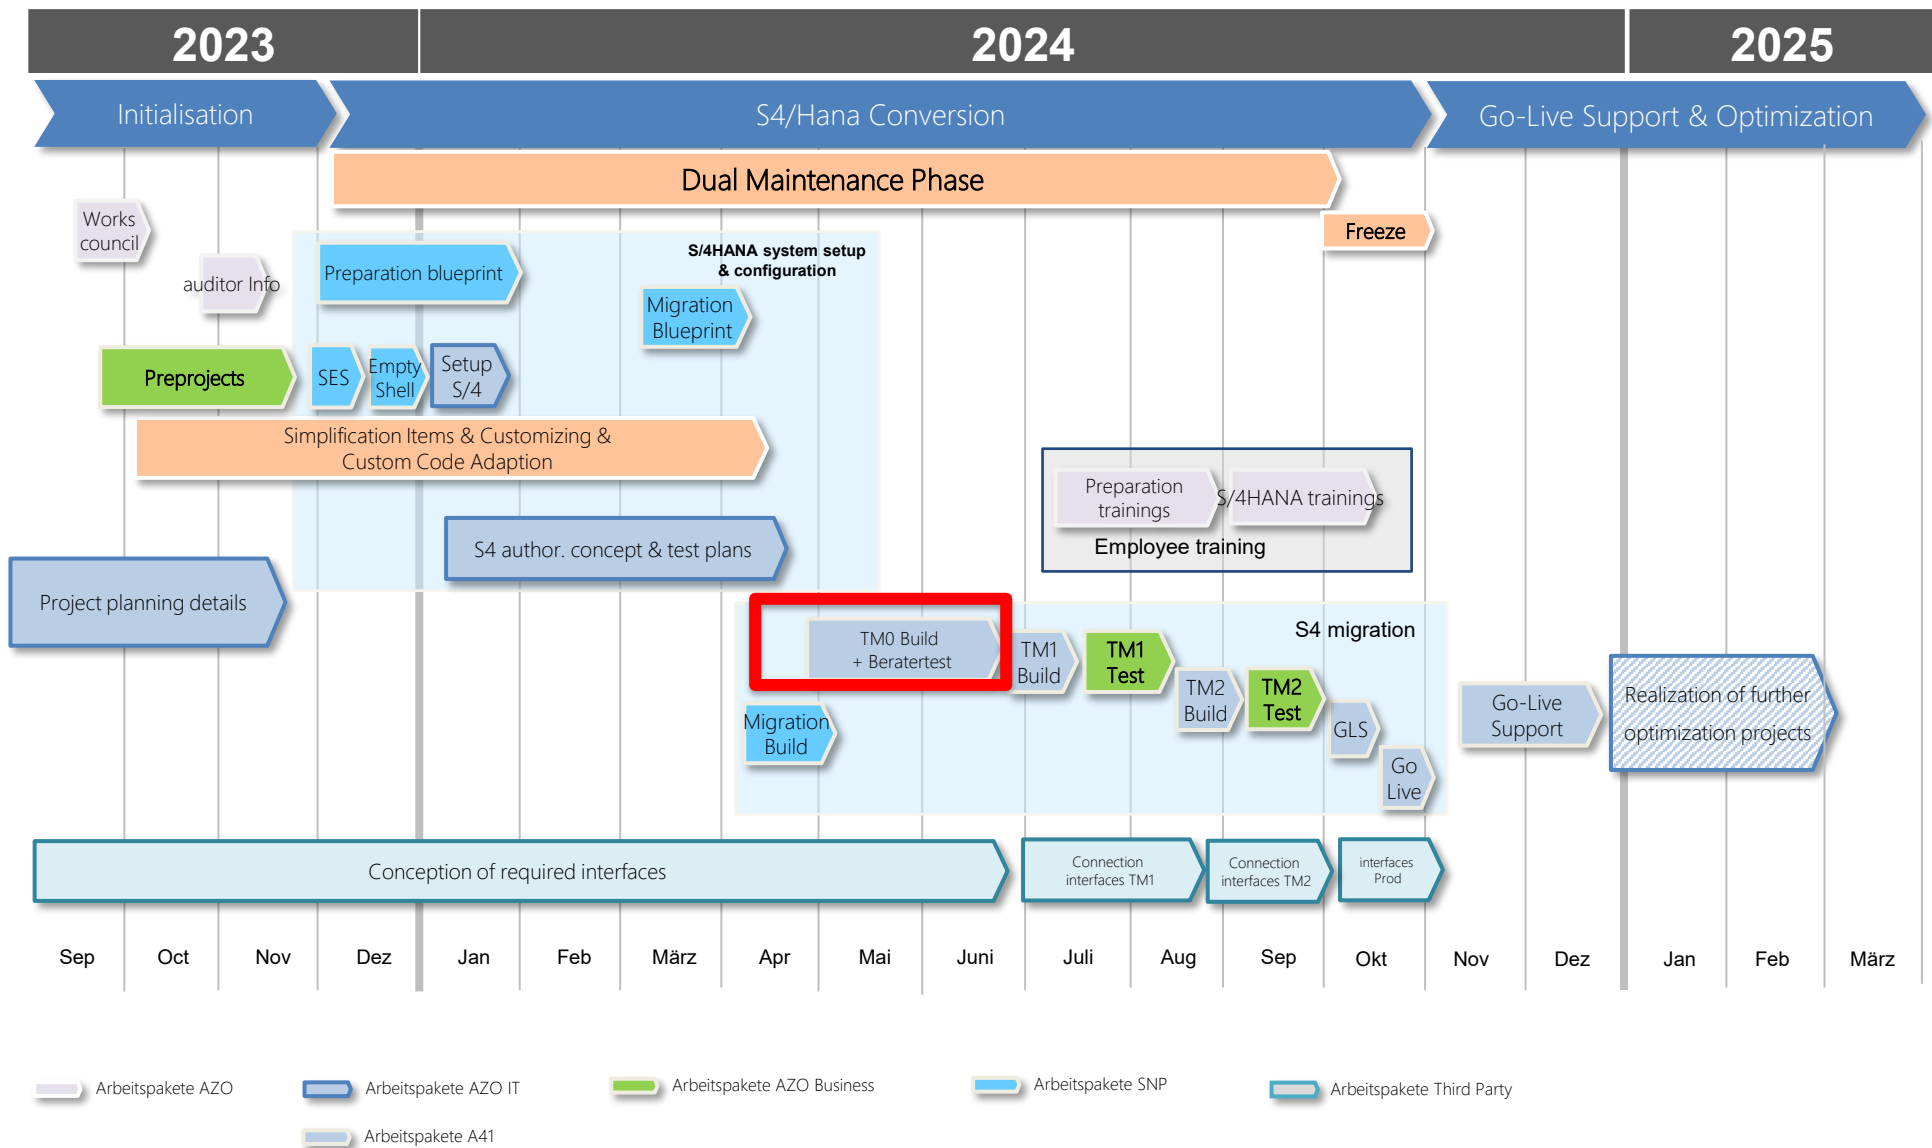

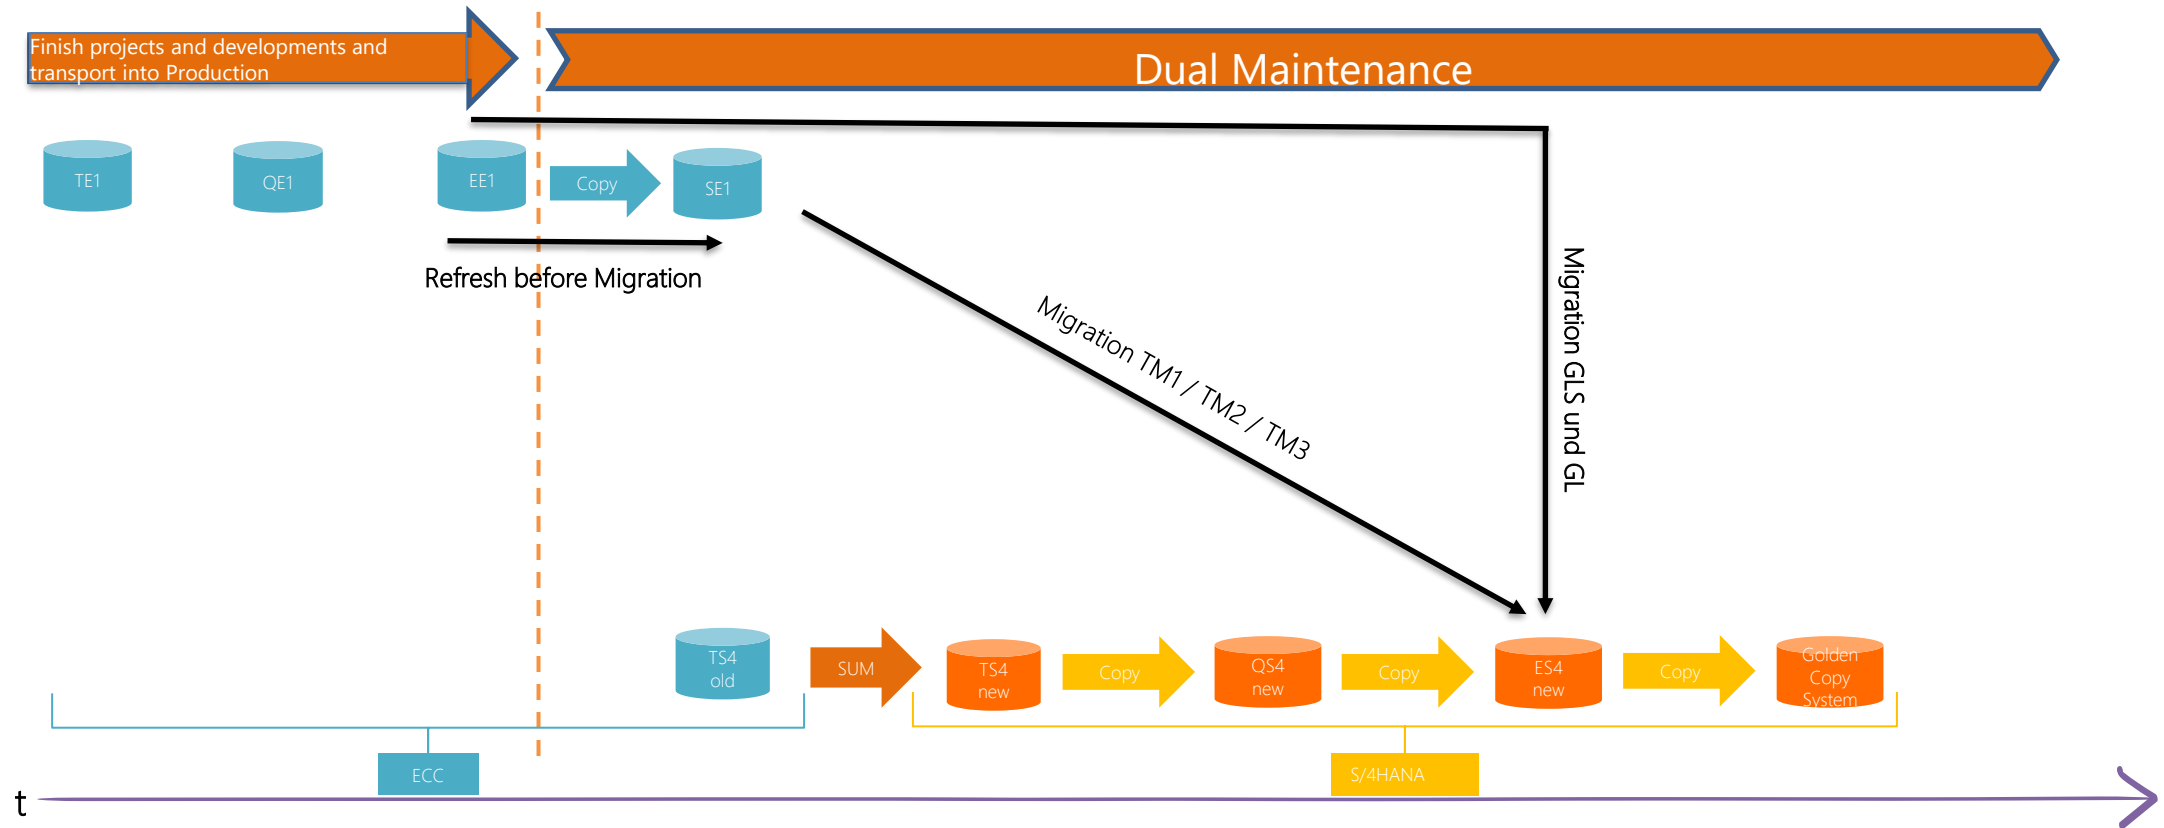

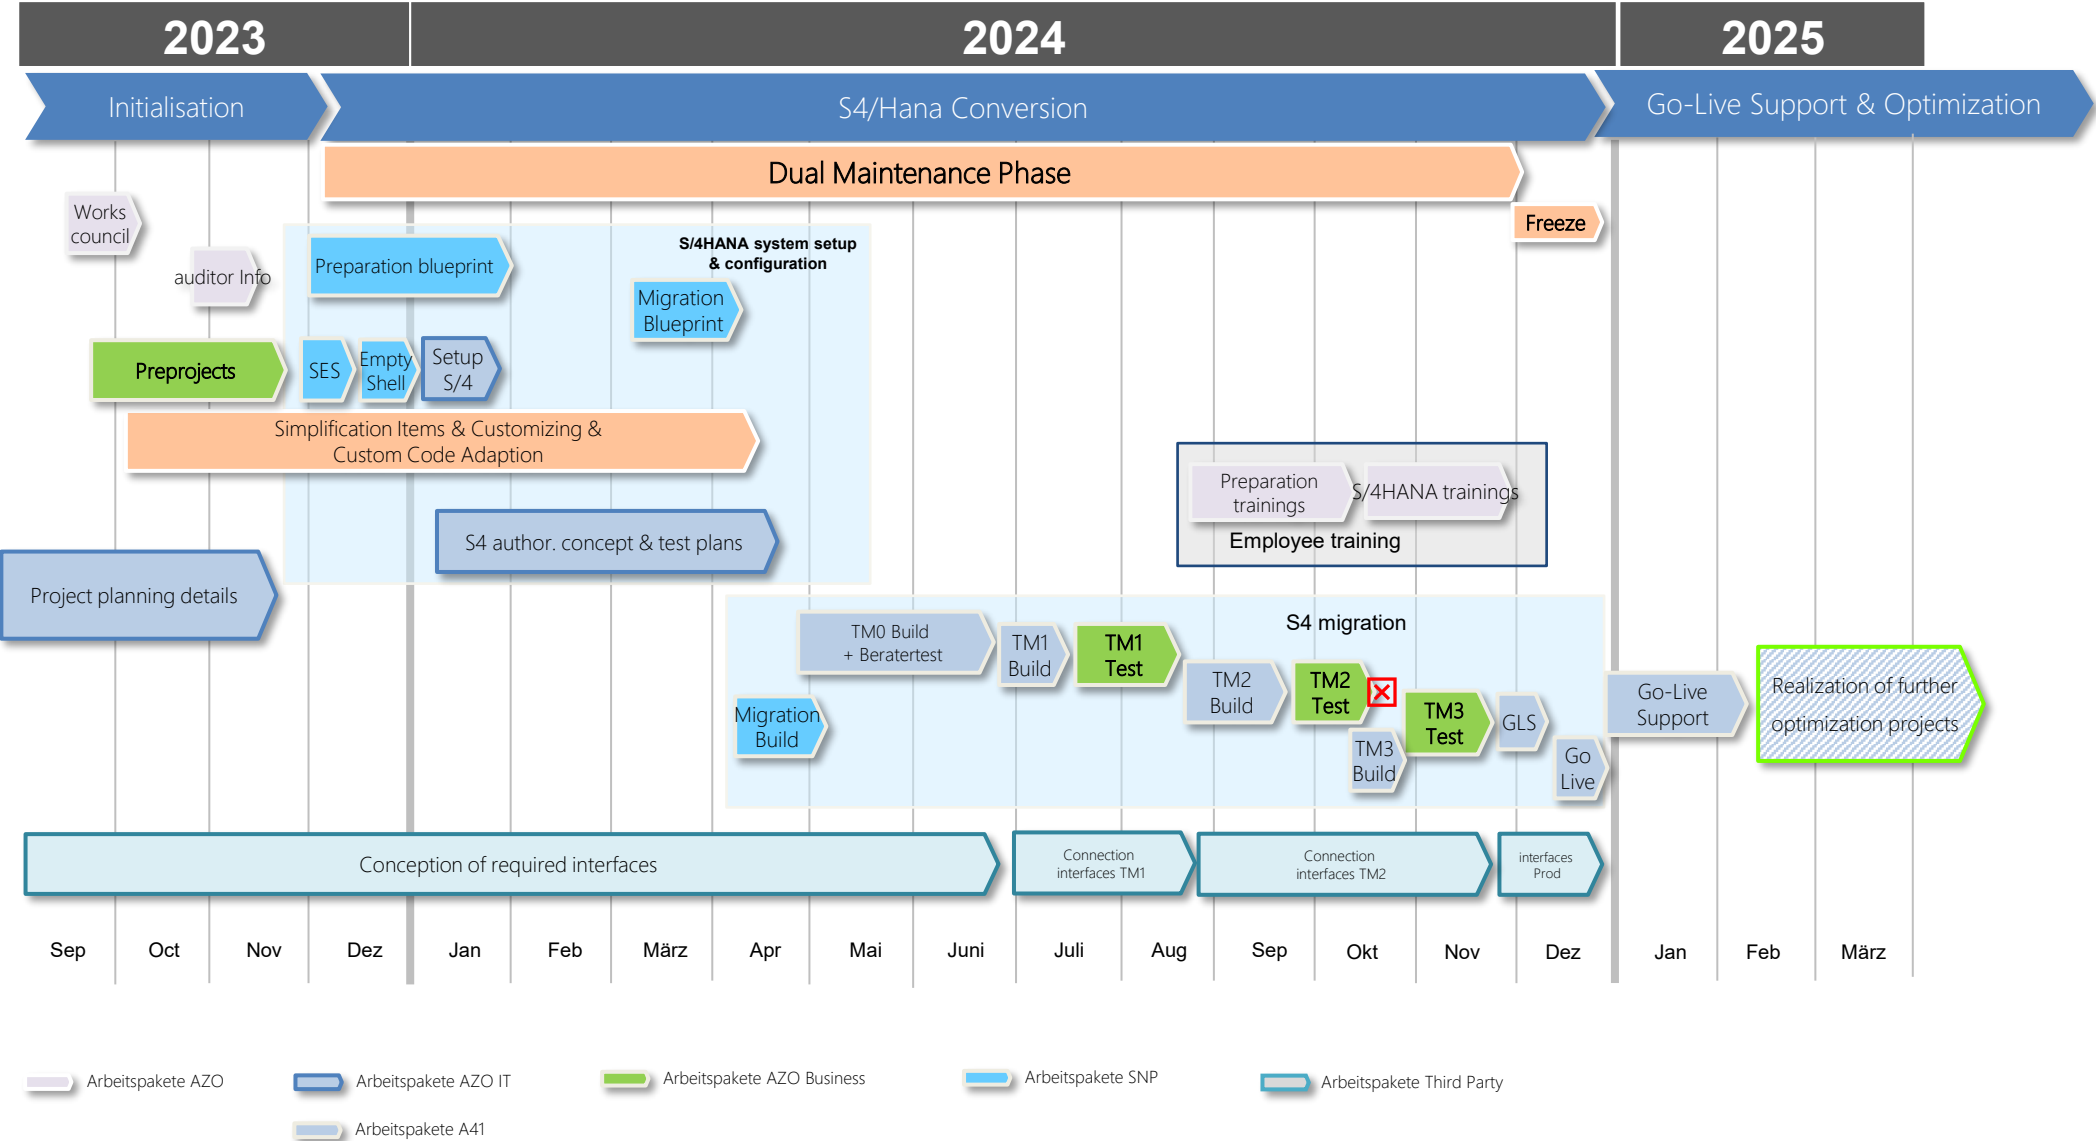

Meetings / Jour Fix / Meilensteine

Definition Key-User

Kommunikation Key-User

Kommunikation Belegschaft

	Teilnehmer				
Zyklus	PL	AfO Berater	AZO IT	AZO Key-User	LKA
Wöchentlich	X				
Alle 2 Wochen	X	X	X		
Alle 4 Wochen	X		X	X	
Alle 8 Wochen	X				X
Kick-Off (Foto)	X		X	X	X
TM 0	X	X	X		
TM 1 – 3	X		X	X	
Bug Tracking Mo Mi Fr (ab TM 1)			X		
Go-Live	X	X	X	CO und FI	X

[illegible]

▼

Ihre Teams

▶

PD

PR DP S/4 Hana Key-User NV-1060

...

▶

PS

PR S/4 Hana Key user AZO-FR

▶

DS

DP S/4 Hana Key-User

▶

PD

PR DP S/4 Hana Key-User THAILAN...

DS

DP S/4 Hana Conversion Kanäle

Suchen Sie die Kanäle, die Sie interessieren, und wählen Sie dann „Anzeigen“, damit sie in Ihrer Kanalliste angezeigt werden.

Alle

Angezeigt

Ausgeblendet

Sortieren: A-Z ▼

Development

Dual Maintenance

Allgemein

Empfohlen

S/4 Hana

LiveSystem - Bug Notification

DevOps Mail, wenn Bugs erstellt werden und kein Bearbeiter eingetragen wurde

Mehrwertbetrachtungen

Empfohlen

PMO Projektleitung

Testmanagement - Intern

Dokumente und Austausch rund um das interne "Management" vom S4 Testmanagement



Key-User: 50 Personen

Weniger als 10% der Belegschaft hat Informationen
über den aktuellen Stand der Conversion.



Wie informieren wir die restlichen Kollegen?

Auf einen Kaffee mit S4 HANA - Episode 1 Erster Über...



Auf einen Kaffee mit S4 HANA - Episode 8 Char...



Auf einen Kaffee mit S4 HANA - Episode 6 SAP Gesch...



	Auf einen Kaffee mit S4 HANA - Episode 1 Erster Überblick / First Overview	
	Stream	
	Auf einen Kaffee mit S4 HANA - Episode 2 Konvertierung unseres bestehenden Systems	
	Stream	
	Auf einen Kaffee mit S4 HANA - Episode 3 Erster Integrationstest / First Integration Test	
	Stream	
	Auf einen Kaffee mit S4 HANA - Episode 4 Custom Code Adaption	19. Juni 2024
	Stream	
	Auf einen Kaffee mit S4 HANA - Episode 5 Testmanagement	15. Juli 2024
	Stream	
	Auf einen Kaffee mit S4 HANA - Episode 6 SAP Geschäftspartner / SAP Business Partners	27. Sept. 2024
	Stream	
	Auf einen Kaffee mit S4 HANA - Episode 7 Getrennte Bewertung / Split Valuation	6. Dez. 2024
	Stream	
	Auf einen Kaffee mit S4 HANA - Episode 8 Chargenverwaltung	11. Dez. 2024
	Stream	

??? Excel ???

??? Devops ???



??? Jira ???

??? Solution Manager ???

Excel


Devops

	A	B	C	D	E	F
1	Werk	Transaktion	(Teil-)Prozess-Titel	Verantwortlicher Tester	Test-Schritt Nummer	Test-Schritt Beschreibung
2	Angebotsbearbeitung					
3	1000	VA21	1000 VA21N Angebote anlegen - Auftragsart ZEAG	LK	1	VA21 - Auftragsart ZEAG
4					2	Position anlegen
5					3	Verfügbarkeitsprüfung aller Lager
6					4	Ablage in Dropzone
7					5	Nachricht als PDF verschicken
8					6	Ausdruck OK? PDF Anhängen

Update:

Testcase title will (by default) be a combination of:

- „Process-title“ (C),
- „Transaction“ (B) and
- „Werk“ (A)

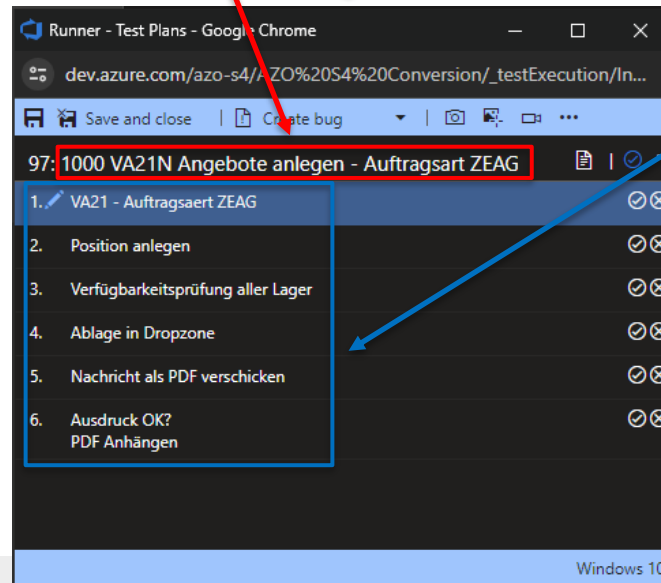

Azure DevOps

azo-s4 / AZO S4 Conversion / Test Plans / AZO OSB

AC

AZO S4 Conversion

+

Overview

Boards

Test Plans

Test plans

Progress report

Parameters

Configurations

Runs

Project settings

«

←

AZO OSB

☆

Mär 12 - Mär 19

Past

1% run, 87% passed.

View report

Test Suites

Filter suites by name

▼ AZO OSB

IT_TM0 (48)

After_Sales (223)

Controlling (494)

Dokumentation (113)

Einkauf (291)

Finance (494)

HR (328)

Lager (124)

Marketing_Kundenstamm (35)

Marketing_Pricing (188)

MDM_Normung

Product_Support_Service (96)

Product_Engineering (111)

Produktion (94)

Produktkonfiguration (75)

PS_PKO (48)

PS_Project_Engineering (182)

PS_SNP (19)

QS (74)

Versand (132)

Vertrieb_Automation (49)

Vertrieb_GBs (ID: 96)

Define Execute Chart

Test Points (117 items)

Run for web application

☐	Title	Outcome	Order	Tester	Werk	Transaktion	Test Case Id
☐	Neues SAP-Hauptprojekt anlegen	Passed	1	Carsten Seeber	1000	ZPS_CREATE	4164
☐	Absprung in Project Builder	Passed	2	Carsten Seeber	1000	CJ20N	4165
☐	Angebot anlegen	Passed	3	Carsten Seeber	1000	CJ20N	4166
☐	Angebot überarbeiten	Active	8	Carsten Seeber	1000	CJ20N	4171
☐	Angebotsinhalt erzeugen / überarbeiten	Passed	9	Carsten Seeber	1000	/JA41/M_XVC	4172
☐	Status zum Vertriebsbeleg	Passed	20	Carsten Seeber	1000	/JA41/M_XVC	4183

Test-Szenarien

Beiträge Dateien Notes

+ Neu Hochladen In Rasteransicht bearbeiten

Test-Szenarien

Name

_AZO_OSB-Beispiel.xlsx

AZO_IT_TM0.xlsx

AZO_OSB-After-Sales.xlsx

AZO_OSB-Controlling.xlsx

After_Sales (ID: 76)

Define **Execute** Chart

Test Points (223 items)

Run for web application

	Title	Outcome	Order	Tester	Werk	Transaktion	Test Case Id
☒	1000 VA21N Angebote anlegen - Auftragsart ZEAG	Active	1	Carsten Seeber	1000	VA21	97
☐	Angebot ändern	Active	2	Carsten Seeber	1000	VA22	98

Runner - Test Plans - Google Chrome

dev.azure.com/azo-s4/AZO%20S4%20Conversion/_testExecution/In...

Save and close | Create bug

97: 1000 VA21N Angebote anlegen - Auftragsart ZEAG

1. VA21 - Auftragsart ZEAG

2. Position anlegen

3. Verfügbarkeitsprüfung aller Lager

4. Ablage in Dropzone

5. Nachricht als PDF verschicken

6. Ausdruck OK? PDF Anhängen

Windows 10



Runner - Test Plans - Google Chrome

dev.azure.com/azo-s4/AZO%20S4%20Conversion/_testExecution/In...

Save and close | Create bug

97*: 1000 VA21N Angebote anlegen - Auftragsart ZEAG

1. VA21 - Auftragsart ZEAG

2. Position anlegen

3. Verfügbarkeitsprüfung aller Lager




4. Ablage in Dropzone

5. Nachricht als PDF verschicken

6. Ausdruck OK? PDF Anhängen



	Title	Outcome	Order	Tester	Werk	Transaktion	Test Case Id
☒	1000 VA21N Angebote anlegen - Auftragsart ZEAG	Passed	1	Carsten Seeber	1000	VA21	97

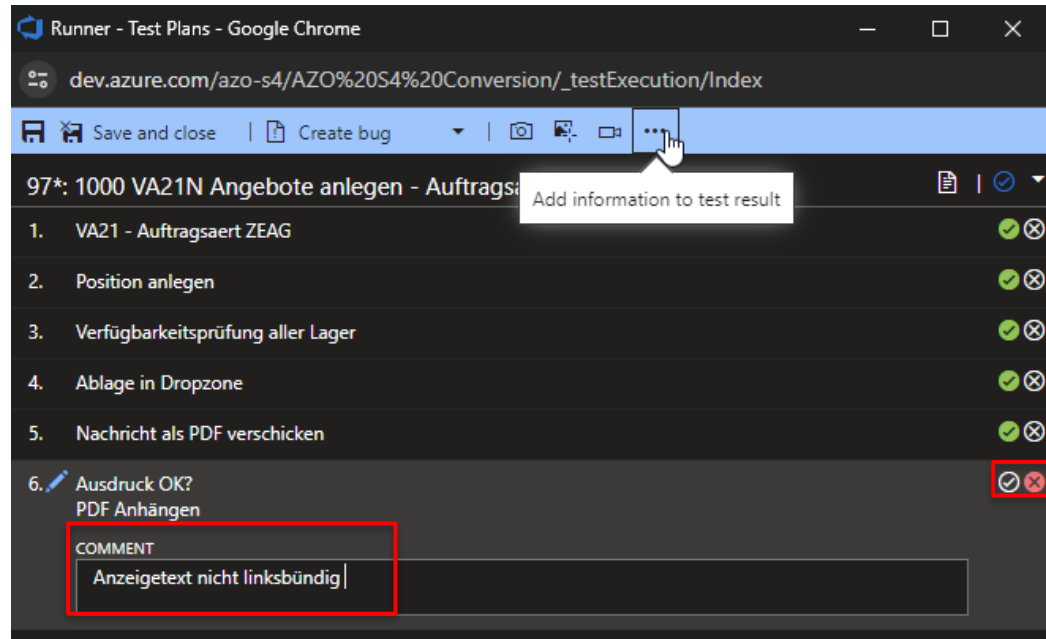

- Anhänge per Drag and Drop
- Aufzeichnung der Schritte vor dem Problem / Fehler

	Title	Outcome	Order	Tester	Werk	Transaktion	Test Case Id
✓	1000 VA21N Angebote anlegen - Auftragsart ZEAG	Failed	1	Carsten Seeber	1000	VA21	97

Runner - Test Plans - Google Chrome

dev.azure.com/azo-s4/AZO%20S4%20Conversion/_testExec...

Save and close Create bug

97*: 1000 VA21N Angebote anlegen - Auftragsart ...

1. VA21 - Auftragsart ZEAG
2. Position anlegen
3. Verfügbarkeitsprüfung aller Lager
4. Ablage in Dropzone

COMMENT

Fehlermeldung xyz (siehe Screenshot)

Screenshot-2024-07-0...
5. Nachricht als PDF verschicken
6. Ausdruck OK?
PDF Anhängen

NEW BUG *

MEANING FULL TITLE

No one selected 0 Comments Add Tag

Start timer Add time (e.g. 15m)

State New Area AZO S4 Conversion

Reason New Iteration AZO S4 Conversion\TM0

Repro Steps

08.07.2024 07:57 Bug filed on "1000 VA21N Angebote anlegen - Auftragsart ZEAG"

Step no.	Result	Title
1.	Passed	VA21 - Auftragsart ZEAG
2.	Passed	Position anlegen
3.	Passed	Verfügbarkeitsprüfung aller Lager
4.	Failed	Ablage in Dropzone
Comments: Fehlermeldung xyz (siehe Screenshot)		
Attachment(s): Screenshot-2024-07-08T07-54-53.961Z.png		
5.	None	Nachricht als PDF verschicken
6.	None	Ausdruck OK? PDF Anhängen

Test Configuration: Windows 10

System Info

Details

Test plan name	Test points	Run % ↓	Passed %	Failed %	Not run count
▼ AZO OSB	3229	88	86	9	385
> After_Sales	221	100	88	7	0
> MDM_Normung	173	100	85	5	0
> Product_Engineering	19	100	84	15	0
> PS_PKO	48	100	97	2	0
> PS_SNP	19	100	89	10	0
> Versand	131	100	96	2	0
> Vertrieb_Automation	57	100	84	14	0
> Vertrieb_GB's	120	100	77	20	0
> Lager	121	100	84	14	0
> PS_Project_Engineering	182	98	94	5	3
> Produktion	93	97	78	21	2
> Produktkonfiguration	75	97	94	5	2
> QS	78	97	84	10	2
> Einkauf	320	95	74	19	15
> Marketing_Kundenstamm	44	90	82	15	4
> Finance	495	89	85	10	54
> Marketing_Allgemein	13	84	100	0	2
> Product_Support_Service	94	78	86	13	20
> Controlling	493	77	88	7	112
> Marketing_Pricing	120	77	98	1	27
> HR	200	59	100	0	81
> Dokumentation	113	46	86	11	61

Details

Test plan name	Test points	Run % ↓	Passed %	Failed %	Not run count
▼ AZO OSB	3229	88	86	9	385

Summary

1

Test plans

3229

Test points

2844 (2844 / 3229)

Test points run

88%

Run

✓

86% (2472 / 2844)

Pass rate

2472

Passed

282

Failed

3

Blocked

83


Not applicable

4

Other

Outcome trend

15.7.2024 - 30.8.2024 ▼

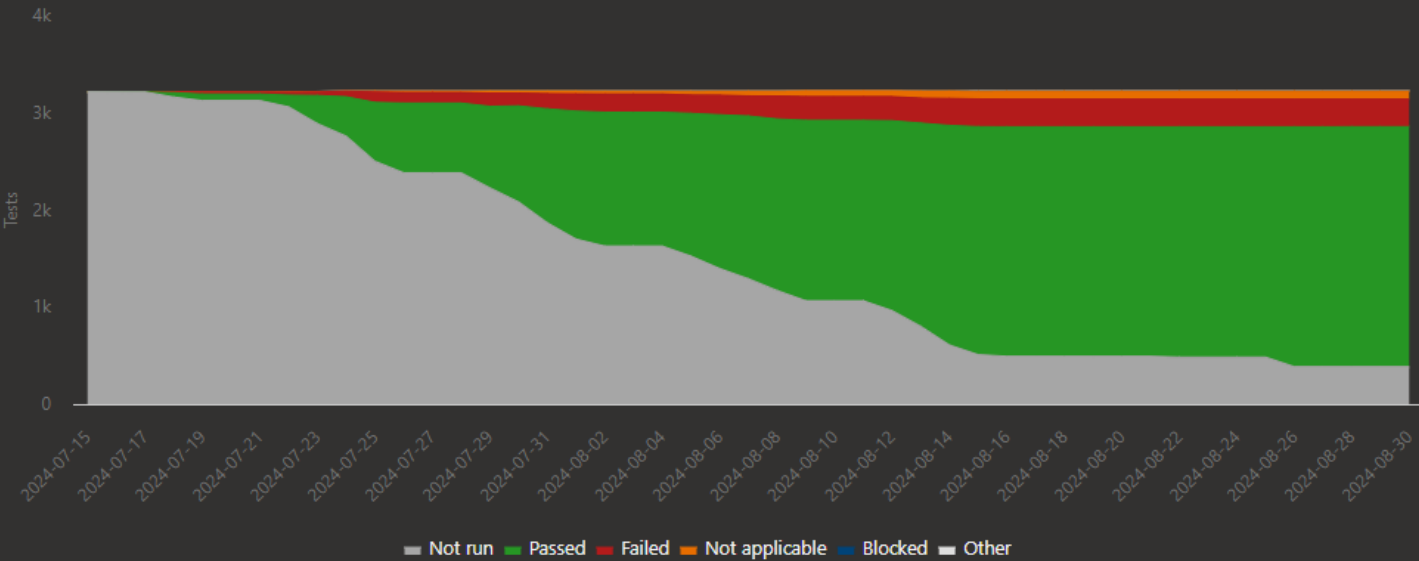

> Marketing_Pricing	120	77	98	1	27
> HR	200	59	100	0	81
> Dokumentation	113	46	86	11	61

Work items

Recently updated | + New Work Item | → Open filtered view in Queries | Column Options | ↑ Import Work Items | Recycle Bin

Filter by keyword

Bug | Assigned to | Resolved | Area | Tags

ID	Title	Assigned To	State	Comments	Activity Date	↑	Created By
12861	error : Make an entry in mandatory field "Branch Code"	Müller Timo	Resolved	2	08.11.2024 08:27:55		Phusanisa Thirakornratch
12838	Messdaten Stoff / Schüttgut - Z_STOFF_DISPLAY	Müller Timo	Resolved	2	08.11.2024 15:34:25		Keller Andreas
12866	Debitor - /SAPSL/DEBMAS_DIRR3	Müller Timo	Resolved	1	11.11.2024 10:56:22		Keller Andreas
12869	GTS Stüli übertragen - /SAPSL/BOMMAT_DIRR3	Müller Timo	Resolved	1	11.11.2024 10:56:32		Keller Andreas
12868	Beschaffungskz. initial übertragen - /SAPSL/PSD_INIT_R3	Müller Timo	Resolved	1	11.11.2024 10:56:40		Keller Andreas
12867	Mat.preis - /SAPSL/PRCMAT_DIRR3	Müller Timo	Resolved	1	11.11.2024 10:56:49		Keller Andreas
12898	Initiale Übertragung Debitoren - /SAPSL/DEBMAS_DIRR3 - 1000	Müller Timo	Resolved	1	12.11.2024 14:30:59		Deutsch Annette
12891	Dokument anlegen - CV01N - 1000	Müller Timo	Resolved	3	13.11.2024 08:10:10		Leimbach Klaus
12897	Nachrichten aus Fakturen - VF31 - 1000	Müller Timo	Resolved	2	13.11.2024 09:05:21		Leimbach Klaus
12890	Proforma erstellen - ZPROFORMA - 1000	Müller Timo	Resolved	3	13.11.2024 09:22:47		Leimbach Klaus
12905	Keine Berechtigungen für die Transaktionen siehe Anhang	Müller Timo	Resolved	2	14.11.2024 15:49:31		König-Siewert Stefan
12892	Konzerne - ZKONZS - 1000	Müller Timo	Resolved	2	19.11.2024 09:37:28		Junker Marion
12973	Z_WB_Pflege Dictionary - 1070No authorization	Müller Timo	Resolved	1	21.11.2024 08:49:09		Lainé Diane

Defect Tracker ☆

Status : closed ×

All closed Items ▾

ID ↓	Status	Title	Severity	Defect category	Responsible for s...	Description	Solution	Subproject
143	Closed	Fehler bei Umkehrbuchung	Critical		Sünnen, Christian	Fehler bei einer Umkehrbuchung im Buchungskreis 3000		FI
142	Closed	Problem Adressen	Critical	Migration	Pfrommer, Stephanie			BP
140	Closed	Fertigungsauftrag verlangt getrennte Bewertung, obwohl Materialstamm keine getrennte Bewertung vorsieht	Medium		Adam Karl-Heinz	Zur Migration wurde unter anderem festgelegt, dass Teile ohne Chargenverwalt... nicht getrennt bewertet werden sollen. Ebenfalls wurde die getrennte Bewertung für Fertigerzeugnis... nicht eingetragen. In beiden Fällen brauchen wir dies auch nicht	Hallo Herr Adam, ich habe eine Datei "Defect 140.docx" angehängt, in der ich das Customizing beschreiben. Das ist derzeit etwas zu großzügig eingestellt. Dort sind 3 Maßnahmen beschrieben, über die entschieden werden muss.	

AZO |

03/2035

40

Prozess	
Ausbau GPD Prozess	
Einführung Chargenverwaltung	
Einführung getrennte Bewertung	
Redesign Profit-Center	

2011

2013

2016

2019

2022

Einführung
SAP R/3
OHNE Chargenverwaltung

Rollout AZO Gruppe
(Belgien, Frankreich)

Alle Kaufteile und
Baugruppen darüber
chargengeführt im
Hauptwerk




Carve-Out
Produktion
Center

Rollout AZO
Gruppe (Thailand)

* Chargen Einzelbewertung

Werk	Chargenführung 2013	Chargenführung 2016	Chargenführung 2019	Chargenführung 2025
1000 AZO	-	✓	✓	✓
1060 Belgien	-	✗	✗	✓
1070 Frankreich	-	✗	✗	✓
1080 Thailand	-	-	✓ *	✓ *
2000 Controls	✗	✗	-	-
3000 Liquids	✓	✓	✓	✓
5000 Produktion Center	-	-	-	✓

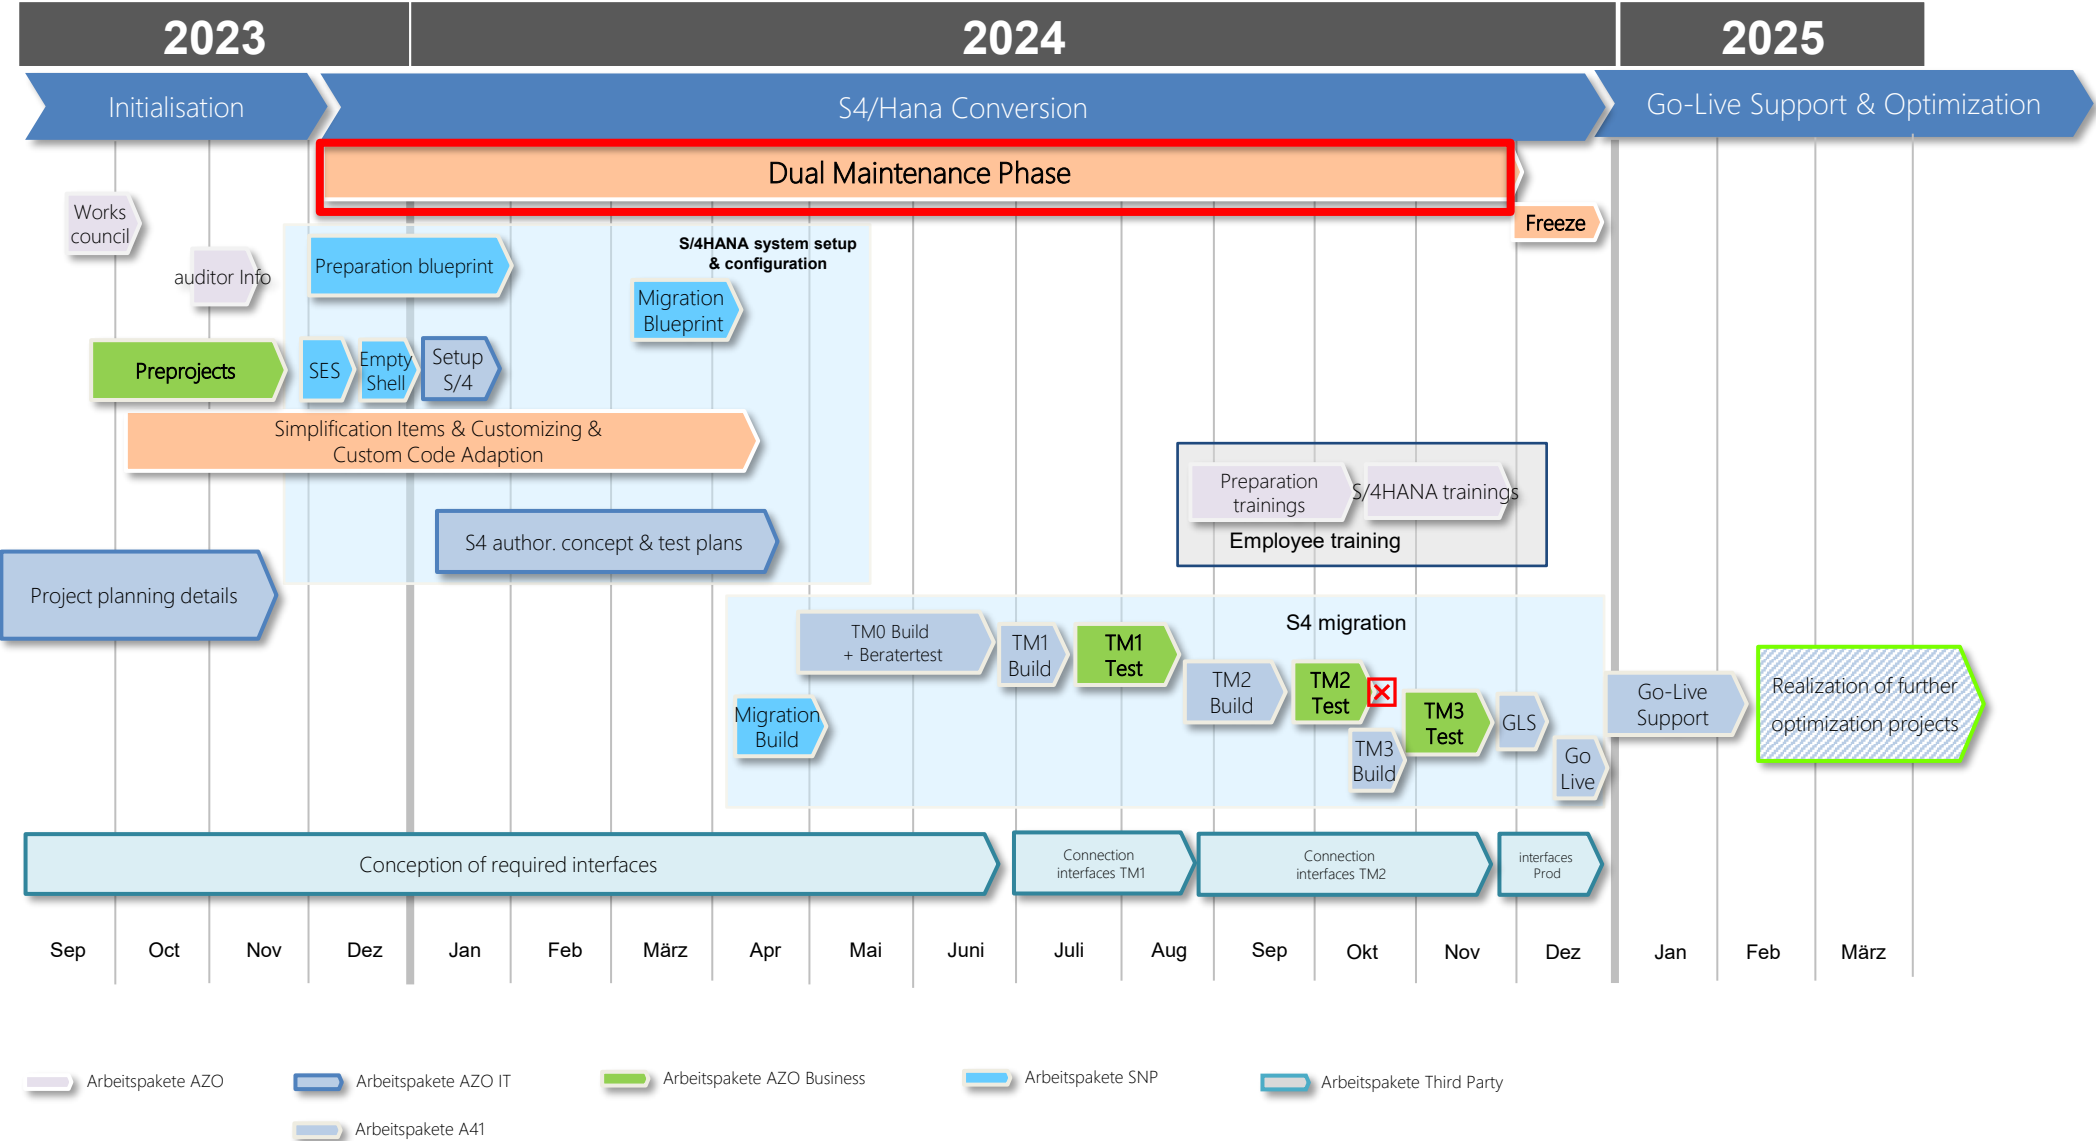

warum low code platform



Alle

Bilder

Videos

News

Kurze Videos


Bücher


Web


: Mehr

Suchfilter

Mithilfe einer Low-Code-Entwicklungsplattform **können Sie Softwareanwendungen ohne Programmierkenntnisse erstellen**. Low-Code ermöglicht es jedem – von erfahrenen Entwicklern bis hin zu Business-Analysten ohne Programmiererfahrung –, schnell und einfach unternehmenstaugliche Anwendungen zu erstellen.

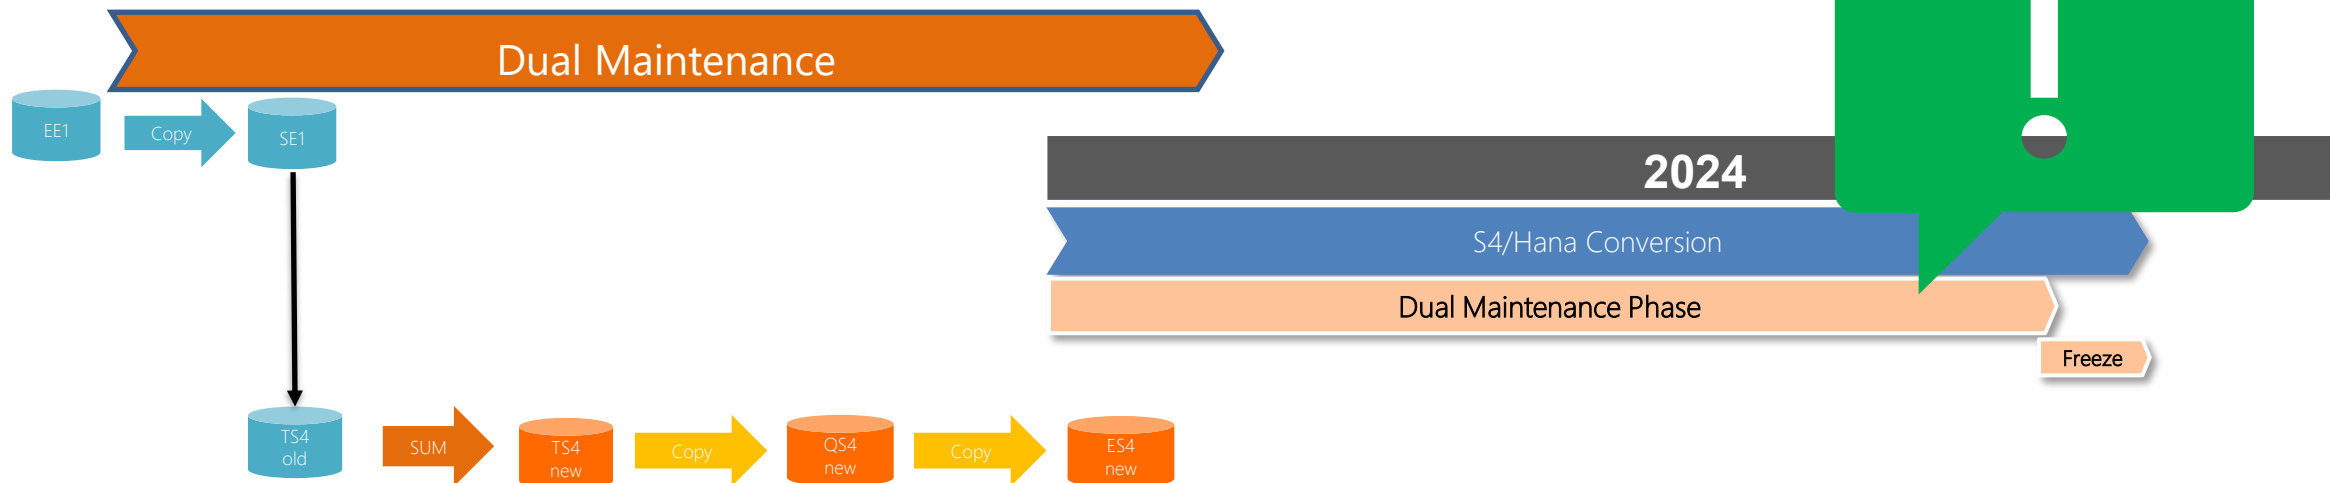

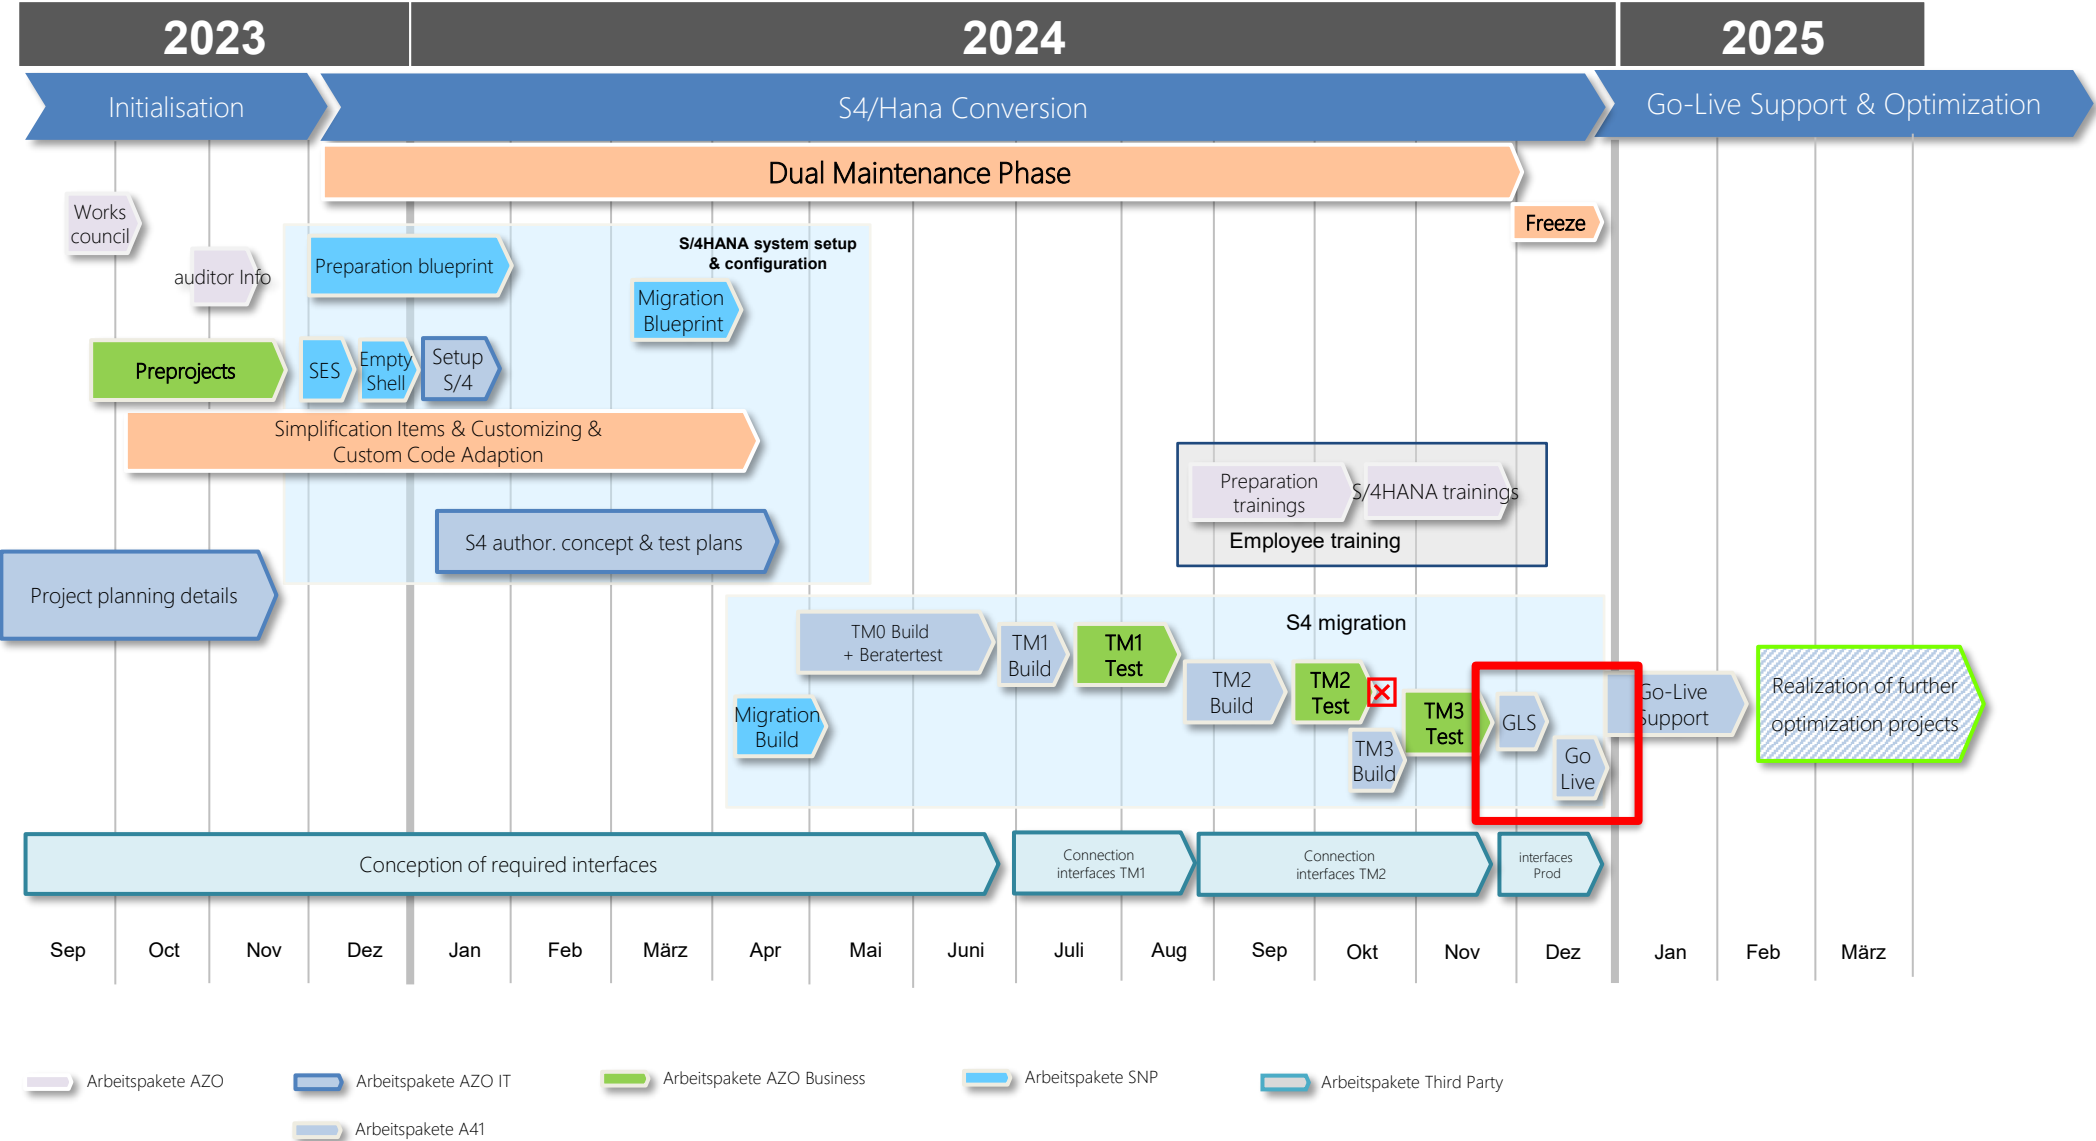

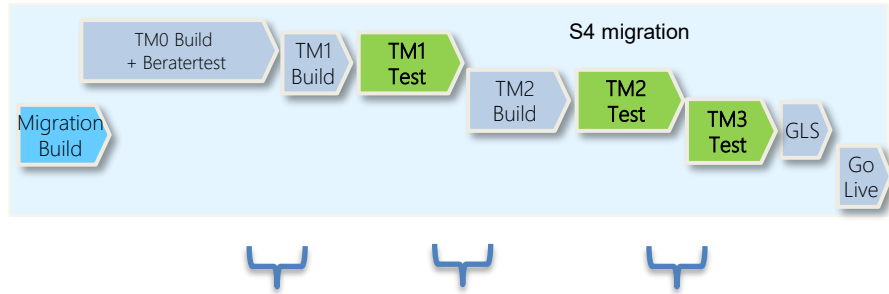

Mehr Zeit nach Testphase und Start neuen Builds

Defect Tracker ☆

Defect category: Migration × Status: closed ×

ID ↓	Status	Title	Severity	Defect cat...
123	Closed	Tabelle mit Dispo PSP sind gefüllt.	Critical	Migration
122	Closed	missing profitcenter in MARC and AUFK	High	Migration

Pflegen einer eigenen Checkliste zur Daten Migration

Dual Maintenance umfasst nicht nur Coding !!!

- Customizing
- „Laufende Einstellungen“ z.B. Kontenfindung
- Drucker
- User
- Layouts
- Varianten
- etc....

Prozess	
Ausbau GPD Prozess	✓
Einführung Chargenverwaltung	✓
Einführung getrennte Bewertung	✓
Redesign Profit-Center	✓

Grundsätzliche Prozessänderungen frühzeitig betrachten.
Einmalige Chance nicht entgehen lassen.

Anzahl Testcases und Bugs im DevOps

	Testcases	Bugs TM1	Bugs TM2	Bugs TM3	Bugs Live Betrieb
AZO OSB	3.229	424	266	54	169
AZO LIQUIDS	456	21	9	1	1
AZO NV	471	36	46	15	38
AZO Frankreich	507	10	5	43	39
AZO Thailand	340	0	27	2	14
Gesamt	5.003	491	353	115	261



AZO interner Aufwand

Gesamtaufwand in Tagen: 1.002

IT 649

Key-User 353

All for One

Project No. & Name	PSP No. & Name	Plantage	Ist März 25	Total
K-014622-0401 AZO, Osterburken - Conversion 4	Ergebnis	395,15	258,48	65%
	K-014622-0401 #AZO, Osterburken - Conversion 4			
	K-014622-0401-3500 Kundenindividuelle Beratung T&M			
	K-014622-0401-3510 Zusätzlicher Massentest			
	K-014622-0401-3520 Finance: Neue Anlagenbuchhaltung prozess			
	K-014622-0401-3530 Finance: SAP Credit Management Basic ein			
	K-014622-0401-3540 Konzeption Business Partner			
	K-014622-0401-3550 Basisunterstützung bei Systemaufbau durc			
	K-014622-0401-3560 PC Rg.: Begleitung Konzeption+Umsetzung			
	K-014622-0401-3570 Einführung Umsatzkostenverfahren			
	K-014622-0401-3580 Einf. Margin Analysis+kundenindiv.Ausprä			
	K-014622-0401-3590 Einf. getrennte Bewertung			
	K-014622-0401-3620 Fachworkshops			
	K-014622-0401-3630 Mehrwertbetrachtung Fachbereiche			
	SUMME Kundenindividuelle Beratung T&M			

Partnerschaft at it's best ☺



„Nervennahrung“




Value Raising Project

Der weitere Weg nach der S4 Conversion



Projektablauf


Konzeptionsphase *identifying value*

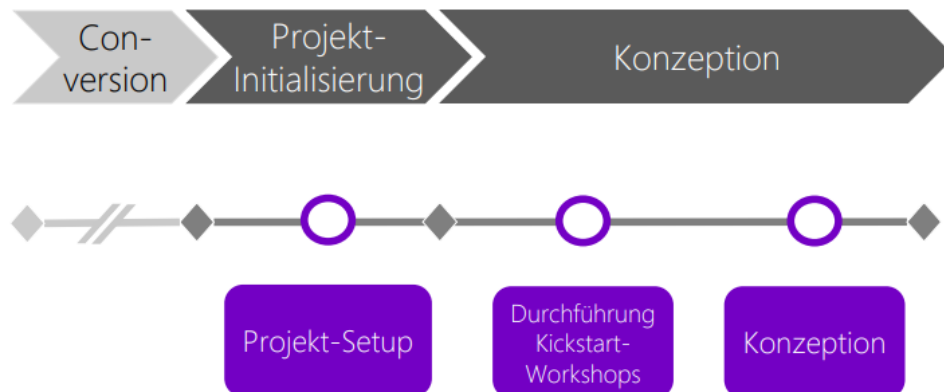

Das Ergebnis der Konzeptions-Phase ist ein *geschätztes & priorisiertes Backlog*.

**WIR STARTEN HEUTE
GEMEINSAM IN DIE
KONZEPTIONSPHASE**

IMPLEMENTIERUNGSPHASE *raising value*

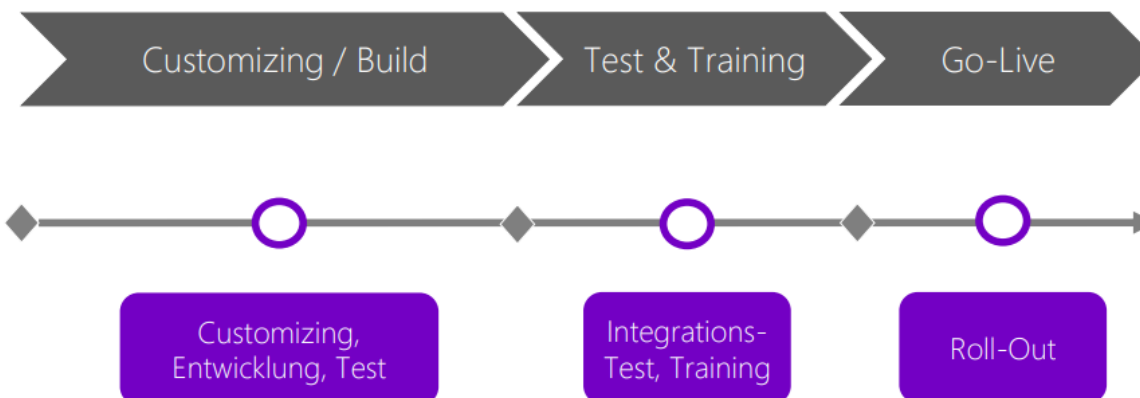


In der Implementierungsphase erfolgt die *Abarbeitung des Backlogs* entlang der definierten Prioritäten. Das Backlog ermöglicht prinzipiell ein agiles Projektvorgehen.



ÜBERSICHT



Unsere Kickstart-Workshops stellen sicher, dass das Projekt erfolgreich abläuft und ihre Mitarbeiter entsprechend ausgebildet sind. Einige wenige sind obligatorisch, da sie für den Projekterfolg eine besondere Bedeutung haben – die meisten können Sie frei wählen:

Touch-Points & Perspektiven 	Analytics-Konzept 	Keep the core clean-Überblick 
Grundlagen SAP S/4HANA Mehrwerte 	AI Use Case Ideation 	Fiori Development-Überblick 
SAP Technology - Überblick 	Enablement-Konzept 	Flow One-Überblick 
Dashboard in One Day (Power BI oder SAC) 	UX Strategie 	Prozessmanagement 
Prüfstand: Analytics Maturity Assessment 	HandsOn & Healthcheck Embedded Analytics 	Dashboard in One Day – Road to Self-Service-BI 

VRP Backlog ☆

Prio: hoch X

Clear filters X

Alle Elemente

MM_ALL + Add view

ID	Titel	Modul	App-ID	Größe/Sizing	Prio ▼	Scoping	Status	Kommentare	Nächste Schritte	Entwicklung notw...
19	Ausschreibungen S/4 HANA inkl. Situation & autom. EKINFO	MM	F2049 Ausschreibung verwalten / F1048 Bestellanforderung bearbeiten	S <= 5 PT	hoch	In Scope		Gesamtprozess unter S4 vorstellen, Wunsch: Darstellung bereits angefragter Banfen vs. Offener Banfen Hinweis: Es ist ein Workflow für die Freigabe von Anfragen in der Erarbeitung bzw. Finalisierung, weitere Details ab Donnerstag 26.06		
33	Referenz Einkaufsorganisation	MM		L bis 15 PT	hoch	In Scope		Vorstellung der Möglichkeit einer Zentralen Einkaufsorganisation. Mit der zentralen Einkaufsorganisation kann ggfs. auch die Problematik bei der Lieferantenbeurteil... für mehrere Werke)		
15	Liefertermin optimierte Beschaffung	MM	F1048 Bestellanforderungen bearbeiten // F1982 Einkaufsinfosätze verwalten	M bis 10 PT	hoch	In Scope		Wunsch; verbesserte Übersicht der Positionen zu einem Lieferanten, spätestes Bestelldatum, Information über Zeit& Preis		Ja
43	Embedded Analytics: Bestellausgabenvergleich - Analyse Basisdaten	MM	F0683	S <= 5 PT	hoch	In Scope	in Test			

SAP

Startseite ▾

🔍

?

🔔

MK

Meine Startseite

Ausschreibungen und Kontrakte ▾

Bestandsbearbeitung

Bestandsführung

Eingang

Einkauf ▾

Rechnungscockpit

Statistische Warennummern

Versand

Mehr ▾

Strategischer Einkauf

Aktivitäten der Einkäufergruppe

Bestell... 267921,21 EUR

Rechn... 237433,89 EUR

Anzahl Bestellung... 64

🔄 vor 5 m

Übersicht Bestellpos & -wert

Lagerbodensatzana-lyse

Nicht berücksichtigte Kontrakte

Es laufen Bestellung...

0.1 %

🔄 vor 19 Std.

Einkaufskontrakte verwalten

...

Kontrakte monitoren

Operativer Einkauf

Überfällige Bestellpositionen

Offene Bestellposi-tionen meiner EK Gruppe

688

Übersicht Lieferant - Material - Nettobetrag

Lieferantenbestäti-gungen überwachen

40

Einkauf gesamt

Warenbewegungs-analyse

Lagerhüterliste

AZO |

03/2035

63

Anzeigewährung:*

Europäischer Euro (EUR) 🔗

Lieferant:

🔗

Material:

🔗

Warengruppe:

🔗

Einkaufskategorie:


🔗

Einkäufergruppe:

Küinkel, Melanie (17 x) 🔗

Einkaufsorganisation:

AZO Global Product x 🔗

Start Filter anpassen (3)**Einkaufskontrakte
überwachen**Sortiert nach Verbrauch, gültig bis und
Zielwert**Lieferantenbestätigungen
überwachen** 3 von 31

Sortiert nach Liefertermin und Wert

Bestätigung fehlt ▾

Bestellanforderungspositionen überwachen

Sortiert nach Liefertermin und Wert

Geöffnet ▾

Anschlusskabel Schuko/Kaltgerätekupplung **in 5 Tagen**
10966757/10 3,0 ST
10,5 EUR

Software SIMATIC PCS 7, Runtime Lic. O.. **in 6 Tagen**
10966759/10 5,0 ST
1.270,5 EUR

Software SIMATIC PCS 7, Runtime Licens.. **in 6 Tagen**
10966758/10 2,0 ST
1.216,6 EUR

**Kontraktunabhängige
Ausgaben** 3 von 14


Als % der Gesamtausgaben

Nach Lieferant ▾

**Ausgaben außerhalb
des Einkaufs** 5 von 114

Als % der Gesamtausgaben

Nach Warengruppe ▾



Sonst. Werkst. HiBe
0,0 (0,00 EUR)

<

SAP

Bestellpositionen überwachen

Apps

Suche in: "Apps"

Q

?

🔔

MK

Standard

📄

📊

🔗

Suchen

Q

Anzeigewährung: *
Europäischer Euro (E...

🔗

Lieferant:

🔗

Material:

🔗

Werk:
=5000 x

🔗

Datum der nächsten Lieferung:

📅

Status der nächsten Lieferung:

▼

Nächste Lieferungen:

▼

Auftragsstatus:

▼

Bestelldatum:

📅

Vollständig geliefert und abg...

Nein

▼

Einkäufergruppe:

=170 x

🔗

Start

Filter anpassen (4)

Bestellpositionen

Details

Anzeigen nach

📄

🔍

🔍

⚙️

↺

📊

📄

📊

📄

Warengruppe

300.000

200.000

100.000

0

195.297,68 EUR

6.174,84 EUR

1.673,66 EUR

189.791,23 EUR

92.051,98 EUR

94.634,43 EUR

32,48 EUR

0 EUR

0 EUR

Elektro (5100)

Automatisierung (5170)

Sonst.Komp. (7890)

Warengruppe

■ Nettobestellwert ■ Zu liefernder Wert ■ Zu berechnender Wert

Bestellpositionen (688)

⚙️

📄

▼

↺

Bestellung	Position	Material	Lieferant	Datum der nächsten Li...	Menge der nächsten Lieferun	
4510286612	00010	Scanner BARTEC SC9EX1 (1452524)			0,00 S	>
4510286612	00020	Griff für BARTEC SC9EX1 (1452527)			0,00 S	>
4510286612	00030	Ladestation für BARTEC SC9EX1 (1452557)			0,00 S	>
4510286612	00040	Service-Vertrag All-in, 3 Jahre (1452558)			0,00 S	>
4510286612	00050	Netzteil USB-A EU-Version TC78ex (1440667)			0,00 S	>
					null	

<

SAP

Massenänderungen an Einkaufsinfosätzen ▾

Standard⁺ ▾

Massenbearbeitung

Herunterladen

Hochladen

Anwendungsjobs

↗

▾

Lieferant:

Material:

Einkaufsorganisation:

Werk:

Infosatztyp:

600128

Start

Filter anpassen (1)

Enter

Einkaufsinfosätze (2.411)

Einkaufsorganisation (5.579)

Einkaufsinfosätze (2.411)

☰

☰

⚙

🔒

▾

☐ Infosatz	Infosatzbezeichnung	Lieferant	Warengruppe	Material	
☐ 5300003930		Siemens AG A+D Mannheim (600128)	Antriebe, Vibratoren (5200)	\$Motor MEHRBER B5 1.5KW EX1500U (1037367)	>
☐ 5300003931		Siemens AG A+D Mannheim (600128)	Antriebe, Vibratoren (5200)	Motor MEHRBER B5 1.5KW EX1500U (1037368)	>
☐ 5300003932		Siemens AG A+D Mannheim (600128)	Wägetechnik (7840)	\$Wägezelle SIWAREX R 500KG SI (1038530)	>
☐ 5300003933		Siemens AG A+D Mannheim (600128)	Antriebe, Vibratoren (5200)	Motor MEHRBER B5 1.1 KW 1000U (1014236)	>
☐ 5300003934		Siemens AG A+D Mannheim (600128)	Antriebe, Vibratoren (5200)	Motor 230/400 B5 1.5KW EX1500U (1042293)	>
☐ 5300003935		Siemens AG A+D Mannheim (600128)	Antriebe, Vibratoren (5200)	Motor 200V/60 B5 0.63KW 1200U (1044570)	>
☐ 5300010132		Siemens AG A+D Mannheim (600128)	Pumpen,Verdicht,Vent (7300)	Schalldämpfereinsatz 2BH15 + 2BH16 (1030298)	>
☐ 5300010133		Siemens AG A+D Mannheim (600128)	Antriebe, Vibratoren (5200)	Motor 380V 60HZ B5 1.75KW 900U (1030277)	>
☐ 5300014402		Siemens AG A+D Mannheim (600128)	Antriebe, Vibratoren (5200)	\$Motor MEHRBER B5 0.9 KW 1700U (1070117)	>

Automatisches Speichern

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !

